



## ΕΡΓΟ

Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

(Ακρωνύμιο: RE-CULT)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕ1
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Π1.2.2 Τεχνικές Συναντήσεις και Π1.2.3 Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης RE-CULT Έκθεση πεπραγμένων εργασιών συμβούλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης “Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου”
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Υπουργείο Τουρισμού
ΈΚΔΟΣΗ:	Τελική
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:	Εμπιστευτικό
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Project Title:**

**«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου»**

**Έκθεση πεπραγμένων εργασιών συμβούλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης “Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου”**

**Αναθέτουσα Αρχή**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**Ημερομηνία υποβολής: 26/09/2022**

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων εργασιών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης “Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου” συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ από την Εταιρεία:



**ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ**  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**

**Έδρα εταιρείας:** Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά

Τηλ: 2310 403371, φαξ: 2310 403372 εσωτ 113

**Γραφεία Αθηνών:** Ερμού 51, ΤΚ 10563, Αθήνα

Τηλ - Φαξ: 2103234811 - 2103239159:

e-mail: [info@gnosianaptixiaki.gr](mailto:info@gnosianaptixiaki.gr)

Ιστοσελίδα: [www.gnosianaptixiaki.gr](http://www.gnosianaptixiaki.gr)

## Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	4
2	Αναλυτική περιγραφή εργασιών Συμβούλου	5
	Γενικά	5
	Παραδοτέο D1.2.2: Τεχνικές Συναντήσεις	6
	Παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης RE-CULT	7
3	Παραρτήματα	11
3.1	Τεκμήρια συμμετοχής στις Τεχνικές Συναντήσεις μεταξύ των εταίρων	11
3.1.1	Ημερήσια διάταξη της 4 <sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης	11
3.1.2	Πρακτικά της 4 <sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης	12
3.1.3	Παρουσίαση του Υπουργείου στην 4 <sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση	18
3.1.4	Ημερήσια διάταξη της 5 <sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης	23
3.1.5	Λίστα συμμετεχόντων στην 5 <sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση	25
3.1.6	Πρακτικά της 5 <sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης	27
3.1.7	Παρουσίαση του Υπουργείου στην 5 <sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση	31
3.1.8	Ημερήσια διάταξη της 6 <sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης	35
3.1.9	Πρακτικά της 6 <sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης	37
3.1.10	Λίστα συμμετεχόντων στην 6 <sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση	44
3.1.11	Παρουσίαση του Υπουργείου στην 6 <sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση	46
3.2	Σχέδιο τροποποίησης σύμβασης	50
3.3	1 <sup>ο</sup> πιστοποιητικό επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο από 01/10/2018 έως 10/09/2021	53
3.4	2 <sup>ο</sup> πιστοποιητικό επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο από 01/06/2021 έως 31/12/2021	55
3.5	6 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου	57
3.6	7 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου	63
3.7	8 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου	69

## 1 Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται από την εταιρεία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και προβλέπεται από τη σύμβαση υλοποίησης του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020»».

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, Ειδικός Στόχος 3.2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος».

Ο κύριος στόχος του Στρατηγικού Έργου RE-CULT είναι η προώθηση και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου σχεδιασμού δράσεων θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.

Κύριος Δικαιούχος της Πράξης είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Η παρούσα έκθεση εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου του Έργου και αφορά στις εργασίες για τα παραδοτέα:

- D1.2.2: Τεχνικές Συναντήσεις
- D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών – διαδικασιών της αναδόχου Εταιρείας που ακολουθήθηκαν για την συμμετοχή της Αναθέτουσας Αρχής στην 4<sup>η</sup>, 5<sup>η</sup> και 6<sup>η</sup> τεχνική συνάντηση της πράξης RE-CULT, καθώς και για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασής της με το Υπουργείο Τουρισμού.

## 2 Αναλυτική περιγραφή εργασιών Συμβούλου

### Γενικά

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που ακολούθησε ο Σύμβουλος για τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/09/2022:

#### Για το Παραδοτέο D1.2.2: Τεχνικές Συναντήσεις

- Συμμετοχή στη 4<sup>η</sup> τεχνική συνάντηση των εταίρων μέσω Zoom
- Συμμετοχή στη 5<sup>η</sup> τεχνική συνάντηση των εταίρων στη Λεμεσό
- Συμμετοχή στη 6<sup>η</sup> τεχνική συνάντηση των εταίρων στη Μυτιλήνη

#### Για το Παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης

- Καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
- Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
- Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».
- Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών.
- Τήρηση Φακέλου παρακολούθησης του έργου.
- Αναφορές Προόδου στην Κοινή Γραμματεία (Project Reporting).

Οι εργασίες της αναδόχου Εταιρείας του Έργου για την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης τεχνικής συνάντησης δύνανται να αναλυθούν σε δύο (2) επίπεδα:

1. Επιστημονικός σχεδιασμός και συντονισμός
2. Οργανωτικός σχεδιασμός

**Παραδοτέο D1.2.2: Τεχνικές Συναντήσεις**

Στο χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 30/09/2022, ο Σύμβουλος συμμετείχε στις εξής τεχνικές συναντήσεις:

**4<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση διαδικτυακά μέσω ZOOM**

Η 4<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. Από μεριάς του Συμβούλου συμμετείχε ο κ. Πρόδρομος Βαδράτσικας – Υπεύθυνος Έργου, προκειμένου να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης της πράξης και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων και ειδικότερα η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου ανά Δικαιούχο, η υλοποίηση ανά Πακέτο Εργασίας, οι σχετικές τροποποιήσεις της Πράξης, καθώς και θέματα διαχείρισης και δημοσιότητας του Έργου.

Στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης, παρατίθενται τα τεκμήρια της 4<sup>ης</sup> τεχνικής συνάντησης.

**5<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση στη Λεμεσό**

Η 5<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στην αίθουσα συνεδριάσεων της δημοτικής βιβλιοθήκης Λεμεσού, την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021. Από μεριάς του Συμβούλου συμμετείχε ο κ. Πρόδρομος Βαδράτσικας – Υπεύθυνος Έργου, προκειμένου να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης της πράξης και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων και ειδικότερα η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου ανά Δικαιούχο, η οικονομική πρόοδος και το χρονοδιάγραμμα του Έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του Έργου.

Στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης, παρατίθενται τα τεκμήρια της 5<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης.

**6<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση στη Μυτιλήνη**

Η 6<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 στο κτίριο Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη. Από μεριάς του Συμβούλου συμμετείχε ο κ. Πρόδρομος Βαδράτσικας – Υπεύθυνος Έργου, προκειμένου να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης της Πράξης, η οικονομική πρόοδος του Έργου, καθώς και θέματα διαχείρισης του Έργου.

Τα τεκμήρια της 6<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης δίνονται στο αντίστοιχο παράρτημα.

**Παραδοτέο D1.2.3: Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης RE-CULT****Δραστηριότητα 1.1: Καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος προέβη στη συστηματική παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και λαμβάνει μέριμνα για την σωστή και εντός των χρονικών πλαισίων υλοποίησή του, ενώ μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων του έργου για τις τακτικές και τις τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RE-CULT, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας, τον Οδηγό του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις) και τα λοιπά εγχειρίδια και έντυπα καθοδήγησης που διέπουν την υλοποίηση των έργων εδαφικής χωρικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η επαφή του Συμβούλου με τους εταίρους και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνεχής, ενώ σε περίπτωση αστοχίας ή καθυστέρησης του σχεδιασμού θα προτείνονται εναλλακτικές οι οποίες θα αξιολογούνται και θα διαμορφώνονται ώστε να βελτιστοποιείται το τελικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος έλαβε υπόψη του το Σχέδιο Ποιότητας του Έργου, το οποίο κατήρτισε το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου ως ο Συντονιστής Εταίρος, για το σύνολο των εταίρων του έργου.

**Δραστηριότητα 1.2: Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020»**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος υποστήριξε την επικοινωνία και αλληλογραφία με τους εταίρους του έργου και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ομάδας Έργου του Συμβούλου και της Αναθέτουσας Αρχής, έγινε μέσω επιτόπιων συναντήσεων, τηλεφώνου και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

**Δραστηριότητα 1.3: Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020»**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου. Συμμετείχε στις συναντήσεις με τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με την προετοιμασία του απαιτούμενου υλικού (π.χ. εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) και ήταν στη διάθεση των εταίρων και της Κοινής Γραμματείας για τυχόν διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες.

**Δραστηριότητα 1.4: Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης RE-CULT μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων**

Η δραστηριότητα αφορά στην προετοιμασία των τευχών διακηρύξεων των διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους υποψήφιους Αναδόχους για αναθέσεις εξωτερικής εμπειρογνομosύνης και την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων. Ο Σύμβουλος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσδιορίζει, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, τον τύπο της προς σύναψη σύμβασης, το είδος της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Στη συνέχεια, η ομάδα Έργου του Συμβούλου συντάσσει, τις **τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη της διακήρυξης του υπό ανάθεση έργου**, τα οποία θα εγκρίνει το αρμόδιο διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Ταυτόχρονα, συντάσσεται η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού. Με ευθύνη του Συμβούλου, τηρείται φάκελος με το σχέδιο της διακήρυξης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο Σύμβουλος θα μεριμνά για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και τις τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναθέσεων (π.χ. Ν.4412/2016), ώστε να τηρούνται ορθά και συνέπεια οι απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης.



Η Ομάδα έργου του Συμβούλου καθ' όλη τη διάρκεια της διενέργειας των Διαγωνισμών, αναλαμβάνει τη **συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής**, όπου αυτή ζητηθεί. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά σε υποστήριξη κατά τη σύνταξη και τεκμηρίωση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης κατόπιν οδηγιών και κατευθύνσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, στη συμβουλευτική υποστήριξη κατά την παροχή διευκρινίσεων προς τους υποψήφιους αναδόχους, στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου διοικητικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή ότι μπορεί να συμβάλει ο Σύμβουλος με την επιστημονική του ικανότητα. Η υποστήριξη μπορεί να αφορά είτε σε επιτόπια παρουσία σε χώρο που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. μέσω Skype) είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του Συμβούλου, τηρείται αναλυτικό αρχείο επικοινωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της Ομάδας Έργου και θα εκπονείται σχετική Έκθεση Πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση καθενός από τους προβλεπόμενους Διαγωνισμούς. Επιπλέον, ο Σύμβουλος θα φροντίζει για την αρχειοθέτηση του συνολικού φακέλου της διενέργειας του Διαγωνισμού από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωσή του σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τέλος, ο Σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων όπως: τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των οικονομικών προϋπολογισμών, παρακολούθηση όλων των προπαρασκευαστικών δράσεων για την υλοποίηση μιας ενέργειας, τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας σε όλες τις διαδικασίες, εποπτεία τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο εκάστοτε ανάδοχος.

Στο χρονικό διάστημα αναφοράς, ο Σύμβουλος υποστήριξε την Αναθέτουσα Αρχή ως προς τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχή με τον Ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Παραδοτέα 2.2.1 και 3.2.2).

#### **Δραστηριότητα 1.5: Τήρηση Φακέλου παρακολούθησης του έργου**

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος έχει δημιουργήσει τους παρακάτω φακέλους σε ηλεκτρονική μορφή:

1. Φάκελος Διοικητικής και Οικονομικής Παρακολούθησης, ο οποίος περιλαμβάνει τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων, την Αίτηση Χρηματοδότησης (application form) του έργου, την Ανάλυση του Προϋπολογισμού (Justification of Budget) και τυχόν τροποποιήσεις και τα λοιπά επίσημα έγγραφα του έργου και του προγράμματος (π.χ. οδηγός υλοποίησης, οδηγός δημοσιότητας, οδηγίες εξειδίκευσης προς Έλληνες εταίρους κ.λπ.). Επιπλέον, περιλαμβάνει την επίσημη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με τους εταίρους, τις εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού κ.λπ.

Τέλος, σε ειδικό υποφάκελο περιλαμβάνονται οι προκηρύξεις διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι ενέργειες προετοιμασίας τους και οι σχετικές αποφάσεις αρμόδιων διοικητικών οργάνων και οι σχετικές δημοσιεύσεις.

2. Φάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης. Μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης, οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή είναι **47.475,52 €** και είναι οι ακόλουθες ανά Παραδοτέο:

- Παραδοτέο 1.2.2: Τεχνικές Συναντήσεις: 2.355,00 €
- Παραδοτέο 1.2.3: Συντονισμός & Διαχείριση - Αναφορές Προόδου: 6.383,52 €
- Παραδοτέο 1.2.4: Πιστοποίηση Δαπανών: 300,00 €
- Παραδοτέο 2.2.1: Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις: 6.526,00 €.
- Παραδοτέο 2.2.2: Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής: 3.450,00 €
- Παραδοτέο 3.2.1: Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Πλάνο Δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μελέτη Κοινής Ανάπτυξης Εναλλακτικού (Θρησκευτικού) Τουρισμού στη βάση Επέκτασης της Τουριστικής Περιόδου: 8.959,00 €.



- Παραδοτέο 3.2.2: Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.: 19.502,00 €.

Ο Σύμβουλος προέβη στη συλλογή και την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, με σκοπό την κατάρτιση του 1<sup>ου</sup> και του 2<sup>ου</sup> αιτήματος πιστοποίησης δαπανών με τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων που έχουν δημοσιευτεί από την Κοινή Γραμματεία με το σύνολο του απαραίτητου συνοδευτικού υλικού, σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος, τις οδηγίες Πιστοποίησης Δαπανών, τις κατευθύνσεις της Κοινής Γραμματείας και των σχετικών Αρχών και Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος προέβη στην προετοιμασία, κατάρτιση, υποβολή και ολοκλήρωση:

- του 1<sup>ου</sup> αιτήματος επαλήθευσης δαπανών ύψους 21.284,52 € για τις δαπάνες που εξοφλήθηκαν και τιμολογήθηκαν κατά την περίοδο από 01/10/2018 έως 10/09/2021,
- του 2<sup>ου</sup> αιτήματος επαλήθευσης δαπανών ύψους 20.372,00 € για τις δαπάνες που εξοφλήθηκαν και τιμολογήθηκαν κατά την περίοδο από 01/06/2021 έως 31/12/2021,

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες, η υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετικά με τις αναφορές οικονομικού αντικειμένου και πιστοποίησης δαπανών, οι οποίες υποβάλλονται στην Αρχή Πληρωμής, ο Σύμβουλος τηρώντας το κανονιστικό πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» μεριμνά:

- Για την ορθότητα της δαπάνης (εάν είναι σύμφωνη με τα συνοδευτικά παραστατικά της Αναθέτουσας Αρχής).
- Για την επιλεξιμότητα της δαπάνης (εάν πράγματι διενεργήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου).
- Για τη συμβατότητα της δαπάνης με τους όρους του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
- Για τη συμβατότητα της δαπάνης με τους κανόνες δημοσιότητας.

Στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης δίνονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά επαληθευμένων δαπανών.

**3. Φάκελοι παρακολούθησης της υλοποίησης των επιμέρους πακέτων εργασίας του έργου:** Μέχρι τις 30/09/2022 τα παραδοτέα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου είναι τα εξής:

- Παραδοτέο 2.2.1 Αρχική εκδήλωση στην Κρήτη. Το παραδοτέο έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Παραδοτέο 2.2.2 Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής: 300 τρισέλιδα φυλλάδια προβολής του έργου σε Ελληνικά και Αγγλικά, 300 usb με εκτυπωμένο τον τίτλο του έργου, το λογότυπο και τα στοιχεία του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, 100 αφίσες, 1 roll-up banner, 300 folders, 300 πάνινες τσάντες, υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφόρησης του κοινού για το έργο με την παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικού σποτ. Τα παραδοτέα έχουν παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Παραδοτέο 2.2.3: Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη: Το παραδοτέο υποβλήθηκε στις 26/09/2022.
- Παραδοτέο 3.2.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου – Ενδιάμεσο Παραδοτέο:
  - Σχέδιο της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού
  - Έκθεση πεπραγμένων από την υλοποίηση της 1<sup>ης</sup> διαδικτυακής διαβούλευσης θέμα: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού» που υλοποιήθηκε στις 11.09.2020 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το παραδοτέο έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Παραδοτέο 3.2.2 Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Το παραδοτέο έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

#### **Δραστηριότητα 1.6: Αναφορές Προόδου στην Κοινή Γραμματεία (Project Reporting)**

Αντικείμενο των ενεργειών του Συμβούλου είναι η προετοιμασία και σύνταξη των αναφορών προόδου έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής απέναντι στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Οι αναφορές αυτές αφενός καταγράφουν την εξέλιξη του έργου, αφετέρου όμως αποτελούν την αποτύπωση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στο χρόνο ανάπτυξης του έργου.

Στόχος είναι σε κάθε αναφορά θα αποτυπώνεται η εξέλιξη του έργου RE-CULT, η σχέση των πεπραγμένων της συγκεκριμένης περιόδου με των προηγούμενες και τις επόμενες. Έτσι, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του έργου, αλλά παράλληλα αποτελούν την περιγραφική εξειδίκευση του σχεδιασμού και των αναδυόμενων στρατηγικών που θα προκύψουν στις διάφορες φάσεις του έργου.

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Σύμβουλος μερίμνησε για τη συλλογή και την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, την κατάρτιση και την υποβολή προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» της 6<sup>ης</sup>, 7<sup>ης</sup> και 8<sup>ης</sup> έκθεσης προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Report) για τις περιόδους αναφοράς 01/01/2021-30/06/2021, 01/07/2021-31/12/2021 και 01/01/2022-30/06/2022, αντίστοιχα.

## 3 Παραρτήματα

### 3.1 Τεκμήρια συμμετοχής στις Τεχνικές Συναντήσεις μεταξύ των εταίρων

#### 3.1.1 Ημερήσια διάταξη της 4<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης



### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Προς όλους τους εταίρους για συμμετοχή στη  
Τέταρτη Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια  
υλοποίησης της Πράξης Re- Cult*

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Χαιρετισμοί
2. Πρόοδος υλοποίησης της Πράξης ανά Πακέτο Εργασίας και ανά εταίρο
3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης για την «Μελέτη για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού» και «Πίνακας προτεινόμενων Δεικτών Ανάπτυξης για το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού»
4. Υποβολή αιτήματος παράτασης
5. Μελλοντικές ενέργειες
6. Ανοιχτή συζήτηση – Τελικά Συμπεράσματα

### 3.1.2 Πρακτικά της 4ης Τεχνικής Συνάντησης

#### Πρακτικά

#### 4ης Τεχνικής Συνάντησης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης 'Re-Cult'

(Meeting ID: 935 8843 9770 - Passcode: 320144)

Την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom η Τέταρτη Τεχνική Συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 'Re-Cult'. Παρόντες στη εν λόγω Τεχνική Συνάντηση ήταν εκπρόσωποι όλων των εταιρών που μετέχουν στην υλοποίηση του έργου.

1. Χαιρετισμοί
2. Πρόοδος υλοποίησης της Πράξης ανά Πακέτο Εργασίας και ανά Εταίρο
3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης για την «Μελέτη για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού» και «Πίνακας προτεινόμενων Δεικτών Ανάπτυξης για το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού»
4. Υποβολή αιτήματος Παράτασης
5. Μελλοντικές ενέργειες
6. Ανοιχτή συζήτηση - Τελικά Συμπεράσματα

#### Συμμετέχοντες:

κα Τομάζου Στέλλα – Υπεύθυνη Έργου ΚΓ

κος Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος (ΚΔ - Υφυπουργείο Τουρισμού)

κα Θεοχάρους Όλγα, κα Αποστολοπούλου Έλια, κος Παντελίδης Πλούταρχος (Δ2- Υπουργείο Τουρισμού)

κος Δρακονάκης Βασίλειος (Δ3- Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (Ι.Α.Κ)

κος Πόγκας Παναγιώτης (Δ4 – Εκκλησία της Ελλάδος)

κος Χαραλάμπους Ιωάννης, κα Ψυλογένη Κενεβέζου Χρυσάιμιλη (Δ5 – Σύνδεσμος Τουριστικών Επενδύσεων Σ.Τ.Ε.Κ)

κος Αναγνωστόπουλος Χρήστος (Δ6 – Πανεπιστήμιο Αίγαίου)

κος Θεοχάρους Αντώνιος (Δ7 – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τ.Ε.Π.Α.Κ)

κος Παπαμακάριος Εμμανουήλ, κος Βαδράτσικας Πρόδρομος (Δ8 – Κ.Ε.Α Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου)

#### I. Χαιρετισμοί

Το Υφυπουργείο Τουρισμού (ΚΔ) εκπροσωπούμενο από τον κο Παπαχριστοδούλου ξεκίνησε την 4<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Όλοι οι συμμετέχοντες εταίροι δήλωσαν την παρουσία τους. Κατόπιν, ο κος Παπαχριστοδούλου από το Υφυπουργείο Τουρισμού (ΚΔ) και η κα Θεοχάρους από το Υπουργείο Τουρισμού χαιρέτισαν τους συμμετέχοντες εταίρους στην τέταρτη τεχνική συνάντηση. Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας Covid-19, δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση της παρούσας τεχνικής συνάντησης διά ζώσης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ευελπιστούν σύντομα να δοθεί η δυνατότητα σε μία δια ζώσης συνάντηση.

## **II. Πρόοδος υλοποίησης της Πράξης ανά Πακέτο Εργασίας και ανά εταίρο – Μελλοντικές Ενέργειες**

Η συντονίστρια της συνάντησης κα Χρύσα Γιαννιούδη από την εταιρία «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έδωσε τον λόγο στους συμμετέχοντες εταίρους αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδο στην οποία βρίσκονται ανά πακέτο εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Αρχικά, τον λόγο έλαβε από το **Υφυπουργείο Τουρισμού (ΚΔ)** ο κος Παπαχριστοδούλου. Σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, ο κος Παπαχριστοδούλου υπογράμμισε ότι η πανδημία δημιούργησε σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση των Παραδοτέων. Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού (Π6.1.1), παραδόθηκε και έγινε αποδεκτή. Συντάχθηκε η Αναφορά Προόδου για την περίοδο αναφοράς (1/7/2020 – 31/12/2020) φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου, ενώ συνεχίζεται η προώθηση του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αναμετάδοση των ραδιοφωνικών σποτ.

Εν συνεχεία, εκ μέρους του **Υπουργείου Τουρισμού (Δ2)** τον λόγο έλαβε η κα Αποστολοπούλου Έλεια αναφορικά με τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τον Απρίλιο του 2021, καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες.

Κατόπιν, ο κος Δρακονάκης Βασίλειος (**Δ3 – Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου**) παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης των παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος των διαγωνισμών, προβαίνοντας σε σύγκριση μεταξύ του αρχικού και του πραγματικού προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το **Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός έργου**, για το Παραδοτέο 1.3.2 έχει υλοποιηθεί η Προκαταρκτική, η Εκπαίδευση ΟΠΣ και οι τέσσερις (4) Τεχνικές Συναντήσεις. Για το Παραδοτέο 1.3.3 έχουν υποβληθεί τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών για το χρονικό διάστημα από 01/10/18 – 31/12/20 και έχουν επαληθευθεί οι εν λόγω δαπάνες για το ίδιο χρονικό διάστημα (Παραδοτέο 1.3.4 – Πιστοποίηση Δαπανών). Επιπλέον, αναφορικά με το Πακέτο Εργασίας 4 – Ανάπτυξη Εργαλείων ICT, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών – υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (08/2019), έχουν υπογραφεί οι Συμβάσεις και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση (10/2019). Συνεχίζοντας με το Παραδοτέο 4.3.1 εκτενέστερη αναφορά έγινε στη Μελέτη Ιεράρχησης και στην επιλογή εξήντα τριών (63) μνημείων που θα αποτυπωθούν σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο, στην εκτίμηση της δυνατότητας συμπερίληψης σημαντικών μνημείων της υπόλοιπης Κύπρου εντός των εξήντα τριών (63) μνημείων και ομαδοποίηση αυτών σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση. Όσον αφορά τα κειμήλια, ο κος Δρακονάκης αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση και στην αναβάθμιση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων (εξυγίανση, προσαρμογή, δομή), στην πλήρη ανάγνωση των στοιχείων βάσης δεδομένων, στο νέο περιβάλλον Χρήστη της Βάσης Δεδομένων, καθώς και στα κριτήρια ιεράρχησης. Επιπλέον, αναφορικά με την πρόοδο των Π.4.3.3 και Π.4.3.4 συνεχίζεται η αποτύπωση και η υλοποίηση των ψηφιοποιήσεων, ενώ για το Πακέτο Εργασίας 6.3.3 έχει ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός Αγοράς Εξοπλισμού καταγραφής και επεξεργασίας υλικής και άυλης πολιτιστικής



κληρονομιάς (5/2019), έχει γίνει αποπληρωμή του εξοπλισμού και έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης.

Συνεχίζοντας την παρουσίαση, ο κος Δρακονάκης προχώρησε στη σύγκριση μεταξύ του αρχικού και του πραγματικού προγραμματισμού. Ειδικότερα, έγινε λόγος για τη γενικότερη καθυστέρηση έναρξης του έργου, για την ειδική καθυστέρηση σχετικά με δαπάνες εντός του 2018, δεδομένης της ημερομηνίας έναρξης του έργου, για τη καθυστέρηση ενός μήνα για τους διαγωνισμούς διαχείρισης και επαλήθευσης, καθώς και για την καθυστέρηση τριών μηνών για τον διαγωνισμό στελέχωσης του εργαστηρίου. Ωστόσο, σχετικά με τον διαγωνισμό αυτόν, οι εργασίες καταγραφής, αποτύπωσης και επεξεργασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτυχώς στο υπόλοιπο του έργου για τι προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο. Τέλος, έχει υπάρξει καθυστέρηση παραλαβής εξοπλισμού λόγω προβλημάτων στις μεταφορικές εταιρείες και στον διαγωνισμό WIFI Hotspots – Hologram.

Σχετικά με την πρόοδο του χρονοδιαγράμματος των διαγωνισμών, παρουσιάστηκαν οι Διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί, ολοκληρωθεί και έχουν υπογραφεί οι σχετικές Συμβάσεις με τον Ανάδοχο, ήτοι για τον Επαληθευτή Δαπανών (Π.1.3.4), για τον Σύμβουλο Διαχείρισης Έργου (Π.1.3.3), για τη στελέχωση του εργαστηρίου ψηφιοποίησης (ΠΕ4), για την αγορά εξοπλισμού (6.3.3), για τα Παραδοτέα 3.3.1 και 3.3.3, ενώ αναφορά έγινε στον Ανοικτό Διαγωνισμό για την αγορά εξοπλισμού (6.3.1), στην επόμενη τεχνική συνάντηση και στον χρόνο όπου εκτιμάται η πραγματοποίησή τους.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ο κος Δρακονάκης μίλησε και για τα επόμενα βήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η συνέχιση υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4 (Καταγραφή/ Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση/ Επεξεργασία Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και η επιμήκυνση του Πακέτου Εργασίας ως το τέλος της πράξης, η επόμενη τεχνική συνάντηση, η πραγματοποίηση της οποίας εκτιμάται για τον 09/2021, καθώς και η αγορά εξοπλισμού WIFI Hotspots – Hologram (6.3.1).

Στη συνέχεια, εκ μέρους της **Εκκλησία της Ελλάδας (Δ4)** ο κος Παναγιώτης Πόγκας παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν γίνει έως σήμερα, καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες.

Ακολουθώντας, ο κος Χαραλάμπους Γιάννης παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν γίνει από τον **Δ5 εταίρο – Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου**. Συγκεκριμένα, έγινε μία αναλυτική παρουσίαση στους συμμετέχοντες εταίρους σχετικά με τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και ακολούθησε μία εκτενέστερη αναφορά στο Παραδοτέο 6.1.1 «Μελέτη ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού».

Έπειτα, ο λόγος δόθηκε στον κο Αναγνωστόπουλο Χρήστο από το **Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Δ6)**. Ξεκινώντας την παρουσίαση, ο κος Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στην έμφαση που έχουν δοθεί στα εξής Παραδοτέα φυσικού αντικειμένου ψηφιοποίησης και καταγραφής και δή στη Μεθοδολογία, στην Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικών Στοιχείων Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Άυλων Στοιχείων Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το ΠΕ 4 «Ανάπτυξη εργαλείων ICT» έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του χρόνου λήξης του Πακέτου Εργασίας. Ακολούθησε μία παρουσίαση της ψηφιοποίησης και καταγραφής των εικόνων και των στοιχείων θρησκευτικής κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συνεχίζοντας με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, σχετικά με το Π.1.4: Πιστοποίηση Δαπανών, στις 24/02/2020 εκδόθηκε το αίτημα έκδοσης απόφασης ανάθεσης, ενώ αναφορικά με τον Π.2.2 «Ηλεκτρονικό και Έντυπο Υλικό Δημοσιότητας» ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και υπηρεσίες τον Απρίλιο του 2020. Τέλος, όσον αφορά το Π.2.3 «Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο κος Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η

διαγωνιστική διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Κοινού Συνεδρίου και υπογράφηκε Σύμβαση τον Οκτώβριο 2020 με εταιρία διοργάνωσης συνεδρίων. Το Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα διεξαχθεί στη Λέσβο με την ολοκλήρωση του έργου.

Ακολουθώντας, από το **Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δ7)** ο κος Θεοχάρους Αντώνης ξεκίνησε την παρουσίασή του με την Πρόοδο υλοποίησης των Παραδοτέων. Ειδικότερα, σχετικά με τα Παραδοτέα 1.7.2, 1.7.3 και 1.7.4 του ΠΕ 1 «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» ο κος Θεοχάρους αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΤΕ.ΠΑ.Κ στις Τεχνικές Συναντήσεις και στις άτυπες συναντήσεις με άλλους εταίρους στην Κύπρο, στην Ανάθεση για την Εξουσιοδότηση Επαληθευτή / Ελεγκτή Πρωτοβάθμιου Ελέγχου και στην καταχώρηση δαπανών στο ΟΠΣ, οι οποίες και επαληθεύτηκαν. Επιπλέον, σχετικά με το ΠΕ 4 «Ανάπτυξη Εργαλείων ICT» ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη μεθοδολογικών πλαισίων για την άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά, διεξήχθη ο Διεθνής Διαγωνισμός (Δ034/2019) για την δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2020, συμβασιοποιήθηκε και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα και εκκρεμούν κάποιες αναπροσαρμογές στην εφαρμογή.

Επίσης, αναφορικά με το ΠΕ 5 «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού» έχει συγκεντρωθεί το υλικό για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (Π.5.7.1) και έχει γίνει μία προκαταρκτική έρευνα σχετικά με το ολόγραμμα (Π.6.7.1).

Έπειτα, ο κος Θεοχάρους αναφέρθηκε στην καταγραφή περισσότερων από 4.500 σημείων ενδιαφέροντος (Πάφος, Αμμόχωστος, Λάρνακα), στην εύρεση θεματικών σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος (Μνημεία UNESCO, θεματικές σε σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος και χώρων στάθμευσης για τις πεδιαδρομές), στη συλλογική φωτογραφικού υλικού σημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος, στην εξωτερική ανάθεση για μετάφραση κειμένων στα Ρωσικά, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση διακομιστή (server) της πλατφόρμας. Επιπροσθέτως, αναφορά έγινε στην πρόσληψη Web Developer & Graphic Designer για την διαμόρφωση της πλατφόρμας, στη συλλογή δεδομένων για την προσβασιμότητα AMEA στη περιοχή της Λεμεσού και στην μελέτη ανάπτυξης 'native' εφαρμογής με δυνατότητα offline πλοήγησης.

Κλείνοντας, ο κος Θεοχάρους παρέθεσε στους εταίρους φωτογραφικό υλικό από εκκλησίες με GEOTAGS και ράμπες προσβασιμότητας, αναφέρθηκε στο χωρικό αποθετήριο (όλα τα δεδομένα χωρικά και μη χωρικά) που φιλοξενείται στην πύλη αναφοράς του έργου <https://recult.cut.ac.cy/portal> και ενημερώνεται από την ομάδα του έργου, στη συλλογή δεδομένων από σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος και διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος, η οποία και ολοκληρώθηκε, ενώ ολοκλήρωσε την παρουσίαση με ένα video 360° από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας.

Τέλος, τον λόγο έλαβε ο κος Παπαμακάριος Εμμανουήλ από το **Κ.Ε.Α Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Δ8)**. Ο κος Παπαμακάριος ξεκίνησε την παρουσίασή του αναπτύσσοντας την πρόοδο του χρονοδιαγράμματος και των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί. Σχετικά με τον Τεχνικό Σύμβουλο Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Παραδοτέα 1.8.3, 5.8.1 και 6.8.2) τον Σεπτέμβριο του 2019 υπεγράφη η Σύμβαση, υποβλήθηκε η Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (12/2019), υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης του Παραδοτέου 5.8.2 (11/2019) και υποβλήθηκε το Παραδοτέο 5.8.1 «Επαγγελματικό Περίγραμμα του Επαγγελματία Θρησκευτικού Τουρισμού» τον Δεκέμβριο 2019. Επιπλέον, έγινε προετοιμασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αναπαραγωγή πληροφοριακού υλικού (Π.2.8.2), προετοιμασία Προκήρυξης για τη δράση «Συμβουλευτική και κατάρτιση σε επαγγελματίες του τουρισμού» (Π.5.8.2), εκκρεμεί το Παραδοτέο 6.8.2 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου



Τουριστικού Πακέτου» και έγινε προετοιμασία προκήρυξη για την εγκατάσταση δύο ψηφιακών ολογραμμάτων (Π.6.8.1).

Σχετικά με το Παραδοτέο Π.2.8.2 «Αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού» στις 24.10.2019 υπεγράφη σύμβαση, ωστόσο εκκρεμεί η δημοσίευση πέντε internet ads για το έργο. Οι καταχωρήσεις θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου προς το τέλος του έργου. Επιπλέον, υποβλήθηκε το Π.3.8.1 με την κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη Στρατηγικού Σχέδιου Θεσμικής Ενίσχυσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο (6/2020). Όσον αφορά το Π.3.8.2 ο εταίρος **Κ.Ε.Α Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Δ8)** συμμετείχε στις 11.9.2020 σε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και τη θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού» του Υπουργείου Τουρισμού. Εκκρεμεί άλλη μία διαβούλευση. Σχετικά με το Π.5.8.2 «Συμβουλευτική και κατάρτιση σε επαγγελματίες τουρισμού» δημοσιεύθηκε στις 25.02.2020 η Προκήρυξη, στις 6.03.2020 υποβλήθηκαν προσφορές από οικονομικούς φορείς, στις 21.05.2020 υπογράφησαν συμβάσεις και στις 15.07.2020 η σύμβαση με το προσωπικό. Στις 24.07.2020 δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση για την προσέλκυση των ωφελούμενων και επιλογή αυτών και στις 31.08.2020 δημοσιεύθηκε η 2<sup>η</sup> Πρόσκληση Ωφελούμενων. Ακολούθως, στις 16.11.2020 ξεκίνησε η κατάρτιση - πιστοποίηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 4.02.2021. Καταρτίστηκαν πενήντα (50) ωφελούμενοι στον Θρησκευτικό Τουρισμό και πιστοποιήθηκαν τριάντα εννέα (39) ωφελούμενοι (Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Θρησκευτικός και Πολιτιστικός ISO/IEC 17024). Το έργο διήρκησε οκτώ μήνες, ενώ έλαβε επιπλέον τρεις μήνες παράταση έως τις 15.3.2021 λόγω Covid-19. Τέλος, για το Π.1.8.4 «Πιστοποίηση Δαπανών» έχει ορισθεί επαληθευτής - ελεγκτής για την έκδοση πιστοποιητικού δαπανών, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> Δελτίου Δήλωσης Δαπανών και η υποβολή του 2<sup>ου</sup> Δελτίου Δήλωσης Δαπανών.

Κλείνοντας τη παρουσιάσή του, ο κος Παπαμακάριος παρουσίασε τις ενέργειες που προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2021. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Π.6.8.2 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Τουριστικού Πακέτου», η υποβολή του 2<sup>ου</sup> Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, η Προετοιμασία προκήρυξης για την εγκατάσταση δύο ψηφιακών ολογραμμάτων (Π.6.8.1), η Συμμετοχή στο Κοινό Συνέδριο (Π.2.8.3), ο προγραμματισμός/ συμμετοχή στις Τεχνικές Συναντήσεις (Π.1.8.2), στο Κοινό Συνέδριο και στις Εκδηλώσεις στην Ελλάδα (Π.2.8.1), καθώς και η υποβολή αιτήματος παράτασης του έργου.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από όλους τους εταίρους, η Συντονίστρια απηύθυνε το λόγο στον κο Χαραλάμπους (Δ5 - Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου), ο οποίος προέβη σε μία αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης για την «Μελέτη για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού» και του «Πίνακα προτεινόμενων Δεικτών Ανάπτυξης για το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού».

### **III. Υποβολή αιτήματος παράτασης**

Η κα Τομάζου Στέλλα απευθυνόμενη σε όλους τους εταίρους επισήμανε την σημασία και την υποχρέωση σαφούς και πλήρους αιτιολογίας για την αίτηση παράτασης ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ορισμένων παραδοτέων από τους εταίρους.

Οι εταίροι εξέφρασαν την ανάγκη τουλάχιστον 6μηνης παρατάσεως, με σκοπό την εξαγωγή ορθών και βάσιμων συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων για το σύνολο του έργου.

Κλείνοντας, την Τέταρτη Τεχνική Συνάντηση, επεσημάνθη σε όλους τους εταίρους η άμεση αποστολή στη Συντονίστρια κα Γιαννιούδη ενός πίνακα σε μορφή excel, στον οποίο θα αναγράφεται ο επιθυμητός χρόνος παράτασης ανά Παραδοτέο, συμπεριλαμβανομένης και της σαφούς και ρητής αιτιολογίας για την οποία ζητείται αυτή, στο πλαίσιο καθορισμού του χρόνου παρατάσεως του έργου εν συνόλω.

3.1.3 Παρουσίαση του Υπουργείου στην 4<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση

23 Απριλίου 2021

RE-CULT

4<sup>η</sup> ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



## Πρόδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

**Σύμβαση 1**  
Απ' ευθείας ανάθεση  
Συνολικός π/υ  
διαγωνισμού: 9.475,80€  
(11.750,00€ με ΦΠΑ)  
Κατακυρωθείσα  
δαπάνη: 10.416,00€ με  
ΦΠΑ)

1.2.2 Τεχνικές Συναντήσεις

1.2.3 Διαχείριση και συντονισμός έργου

2.2.3 Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη

Υπό υλοποίηση

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος φυσικού αντικειμένου

- Αναφορές προόδου
- Προετοιμασία τευχών προσκλήσεων και διακηρύξεων για τις αναθέσεις

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

Σύμβαση 2  
Απ' ευθείας ανάθεση  
Συνολικός π/υ  
διαγωνισμού:  
1.209,68€  
(1.500,00€ με ΦΠΑ)

1.2.4 Εξακρίβωση δαπανών από ανεξάρτητο  
ελεγκτικό γραφείο, π/υ 1.500€

(Μήνες 1-36)

Υπογραφή σύμβασης: 04.2021

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόσδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

Σύμβαση 3

Απ' ευθείας ανάθεση

Συνολικός π/υ:

4.032,26€

(5.000,00€ με ΦΠΑ)

Κατακυρωθείσα

δαπάνη: 3.450,00€ με

ΦΠΑ)

2.2.2 Ηλεκτρονικό και Έντυπο υλικό πληροφόρησης και προβολής

Ολοκληρώθηκε

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόσδος φυσικού αντικείμενου

- Παραγωγή και παραλαβή φυλλαδίων, USB, folder, αφισών, roll-up banner, πάνινων τσαντών
- Ραδιοφωνικό σποτ

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

<p><b>Σύμβαση 4</b> Συνοπτικός διαγωνισμός</p> <p>Συνολικός π/υ: 43.548,39€ (54.000,00 € με ΦΠΑ)</p> <p>Κατακυρωθείσα δαπάνη: 33.480,00€ με ΦΠΑ)</p>	<p>2.2.1 Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Ελλάδα</p>
	<p>3.2.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου</p> <p>3.2.2 Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας</p>

### 3.2.1 Ολοκληρώθηκε 2.2.1 & 3.2.2: Υπό υλοποίηση

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος φυσικού αντικειμένου

### Αρχική εκδήλωση στην Κρήτη (2.2.1)

- Προτεινόμενη ημερομηνία: ?????
- Χώρος: Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
- Ομιλητές
- Θεματολογία και ημερήσια διάταξη

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος φυσικού αντικειμένου

**Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (3.2.2)**

- Ενέργειες διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς για το περιεχόμενο του Μνημονίου
- Διοργάνωση στρογγυλής τράπεζα στη Ρόδο για παρουσίαση του μνημονίου και των δράσεων
- Υπογραφή και υιοθέτηση μνημονίου συνεργασίας
- Προτεινόμενη ημερομηνία: ????

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ευχαριστώ πολύ

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



### 3.1.4 Ημερήσια διάταξη της 5<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης



## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

### 5<sup>η</sup> ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ RE-CULT

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ

**ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:** Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269, Λεμεσός


<https://goo.gl/maps/ZqeWtKQE29nMRWTV8>

**ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ:**

<https://us02web.zoom.us/j/88994439076?pwd=Qkp0VnJmbTVVYVVM0N2p4ZlVGZFJYZz09>

#### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

- ΚΔ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κύπρος)
- Δ2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ελλάδα)
- Δ3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)
- Δ4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελλάδα)
- Δ5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)
- Δ6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ελλάδα)
- Δ7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)
- Δ8 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (Ελλάδα)



Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Σελ. 1



## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

5<sup>η</sup> ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ RECULT

9:30 - 10:00	Προσέλευση - Εγγραφές
10:00 - 10:15	Έναρξη συνάντησης - Χαιρετισμοί
10:15 - 11:15	Πρόοδος υλοποίησης της πράξης ανά εταίρο
11:15 - 11:30	Διάλειμμα
11:30 - 12:30	Πρόοδος υλοποίησης της πράξης ανά εταίρο (Συνέχεια)
12:30 - 12:45	Συζήτηση χρονοδιαγραμμάτων του έργου
12:45 - 13:15	Συζήτηση εκκρεμοτήτων και συντονισμός εταιρικού σχήματος
13:15 - 13:30	Συζήτηση γύρω από την βιωσιμότητα των εκρών και αποτελεσμάτων
13:30 - 13:45	Συμπεράσματα - Σύνοψη
13:45 - 14:00	Λήξη τεχνικής Συνάντησης

3.1.5 Λίστα συμμετεχόντων στην 5<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση



**ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ**  
**5<sup>ης</sup> ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ RE-CULT**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ  
 ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269, Λεμεσός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΦΟΡΕΑΣ	EMAIL	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Hristo Andreou	ΤΕΠΑΚ	hd.andreou@edu.cut.ac.cy	
Χρυσή Γιαννιούδη	Proopsis Consulting SA	ch.giannioudi@proopsis.gr	
Αριάννη Γιαννιούδη	-"-	a.giannioudis@proopsis.gr	
Μαρίλη Παπακλερίου	ΚΕΑ ΙΜ Σέρου	maripapapakleliou@gmail.com	
Νίκος Χρυσίνας	ΚΕΑ ΙΜ Εφύ	nfo@keaimsxva.gr	
Τομαζοι Στεφίλα	Κοιμη Γραμματεία	stomazoi@motf.gov.cy	
Χαράλαμπος Παρασκευά	ΙΑΚ	nethrhp@hotmail.com	
Αντώνης Θεοχάρης	ΤΣΤΙΑΚ	antonis.theocharidis@cut.ac.cy	
Πέτρος Κοσμάς	ΤΕΠΑΚ	petros.kosmas@cut.ac.cy	

**ΔΕΣΜΟΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου Σελ. 1



**ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ**  
**5<sup>ης</sup> ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ RE-CULT**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ  
 ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269, Λεμεσός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΦΟΡΕΑΣ	EMAIL	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥ	ΤΕΠΑΚ	maria.papathoofanou@cut.ac.cy	
Έβια-Νικολέτα Αποστολαίου	Υπ. Τουρισμού	apostolaraou-np@mintour.gr	
Πρόσλητος Βασιλείδης	ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΛ	proslitis@yasilidhis.com	
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	caheag@aegean.gr	
Κωλύβα Μουλλωτάι	ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ	muulloutai@gmail.com	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΟΣ	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	ddvergat@aegean.gr	
Όλγα Θεοχάρους	Υπ. Τουρισμού	theocharous@visitcyprus.com	
Χρυσή Φιλοξάνη	ΣΤΕΚ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΧΗΣ	ΟΛΙΑΣ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	

**ΔΕΣΜΟΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου Σελ. 2



# ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 5ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ RE-CULT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269, Λεμεσός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΦΟΡΕΑΣ	EMAIL	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Βασίλης Δρακωνίδης	ΙΑΚ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΚΑΣ	Επιχειρησιακή Ομάδα	Διαδικτυακή Συμμετοχή	
Αθηνά Θεοδωρόπουλου	ΟΠΑΣ	Διαδικτυακή Συμμετοχή	
Χριστόδωλος Παπαχριστοδωλάκης	Κυπριακή Περιφέρεια	Διαδικτυακή Συμμετοχή	

**ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Σελ. 3

### 3.1.6 Πρακτικά της 5ης Τεχνικής Συνάντησης



## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

### 5ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ RE-CULT

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ**

**ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραϊσκάκη & Αγίου Ανδρέου 269, Λεμεσός**

<https://goo.gl/maps/ZqeWtKQE29nMRWTV8>

#### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΔ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κύπρος)

Δ2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ελλάδα)

Δ3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)


Δ4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελλάδα)

Δ5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)

Δ6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ελλάδα)

Δ7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)

Δ8 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (Ελλάδα)

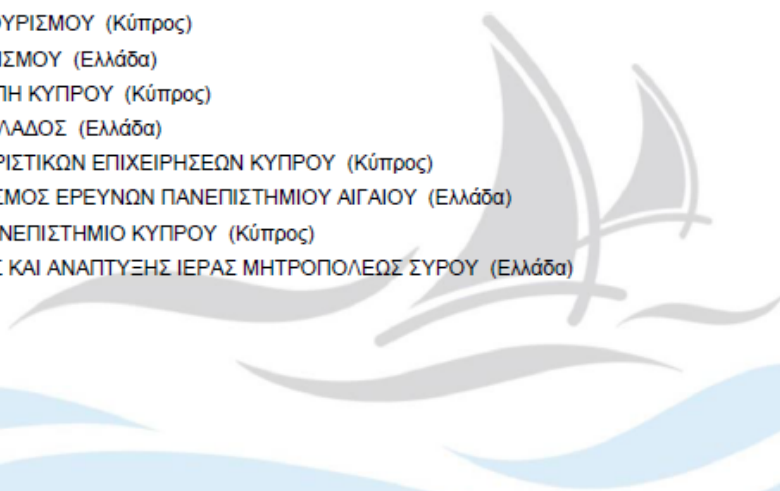

Σελ. 1

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου





## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

### 5<sup>ης</sup> ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ RE-CULT 17/03/2022, ΛΕΜΕΣΟΣ

Την Πέμπτη 17/03/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση του έργου RE-CULT για την Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Η συνάντηση έλαβε μέρος στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στην Λεμεσό υβριδικά. Υπήρχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης.

Δια ζώσης συμμετείχαν οι φορείς: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κύπρος), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ελλάδα), ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος), ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ελλάδα), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος), ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (Ελλάδα)

Διαδικτυακά συμμετείχαν οι φορείς: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελλάδα), ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος).

Για την πλήρη λίστα συμμετεχόντων βλ. Λίστα συμμετεχόντων 5<sup>ης</sup> τεχνικής συνάντησης

Η Τεχνική συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για το ΤΕΠΑΚ κ. Αντώνη Θεοχάρους και την κ. Όλγα Θεοχάρους από το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου. Ακολούθησαν παρουσιάσεις προόδου από τον κάθε εταίρο που αφορούσαν την πρόοδο ως προς το φυσικό αντικείμενο και των εκροών του έργου, των διαγωνισμών και απαραίτητων διαδικασιών του έργου.

Αρχικά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε την πρόοδο του ανά παραδοτέο του έργου, κάνοντας εκτενή αναφορά στην πλατφόρμα γεωπληροφορικής ΜΙΤΟΣ αλλά και στις δράσεις επαυξημένης πραγματικότητας παρουσιάζοντας demos αντίστοιχων εμπειριών. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι δράσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως η προμήθεια υπολογιστή για την δημιουργία και επεξεργασία ολογραμμάτων. Σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, η καθυστέρηση οφείλεται στην γενικότερη έλλειψη στην αγορά καρτών γραφικών με αποτέλεσμα οι προσφοριοδότες να μην θέλουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ωστόσο, εκτιμάται πως ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Στην συνέχεια, ο επικεφαλής εταίρος Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου παρουσίασε την πρόοδο του και τις δράσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Ακολούθησε το Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας αναφέροντας την πρόοδο του ως προς το φυσικό αντικείμενο και τα χρονοδιαγράμματα των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη, η διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας στη Ρόδο στις 22/07/2021 και οριστικοποιήθηκε το μνημόνιο συνεργασίας και υπογραφή από ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης, Η αρχική εκδήλωση για το Π2.2.1 διοργανώθηκε στην Κρήτη στις 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολούθησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με παρουσίαση πεπραγμένων του έργου καθώς και προβολή εντυπωσιακού υλικού ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Κύπρο που έγινε στα πλαίσια του έργου. Η ΙΑΚ αναφέρθηκε κυρίως στις δράσεις ψηφιοποίησης υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε θέματα εργαστηρίου, εξοπλισμού, αλλά και κάποια ζητήματα που αντιμετώπισε κατά την διαδικασία ψηφιοποιήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσίασε τις δράσεις και την πρόοδο του, προβάλλοντας εντυπωσιακό υλικό ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην ψηφιοποίηση μνημείων, ιερών εικόνων και κειμηλίων με τεχνικές 3D σάρρωσης και φωτοφραμετρίας αλλά και ψηφιοποίηση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε μορφή βίντεο.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου το οποίο έκανε αναφορά στην πρόοδο του έργου ανά παραδοτέο και την καταγραφή των τουριστικών πόρων στις Κυκλάδες και στην Κύπρο και στην ανάπτυξη θεματικών τουριστικών πακέτων θρησκευτικού τουρισμού.



Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε το Π5.8.1 «Επαγγελματικό Περίγραμμα του Επαγγελματία Θρησκευτικού τουρισμού» και το Π6.8.2 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου Κυκλάδες – Κύπρος». Εκκρεμεί η υλοποίηση 5 Internet Ads με το μήνυμα της επικοινωνιακής στρατηγικής, για την προβολή του έργου και των δράσεων του στο διαδίκτυο καθώς και η ολοκλήρωση του πακέτου εργασίας Π6.8.1. για την προμήθεια και τοποθέτηση των ολογραμμάτων και ολοκλήρωση του παραδοτέου.

Στη συνέχεια ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου παρουσίασε την μέχρι στιγμής πρόοδο του και έδωσε έμφαση στην έρευνα στην Θρησκευτικό Τουρισμό και στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών τουρισμού. Συγκεκριμένα, ο ΣΤΕΚ έκανε αναφορά στην συμμετοχή του σε όλα τα παραδοτέα που ήταν σχετικά με την συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις. Ο ΣΤΕΚ ανέφερε την τροποποίηση των προδιαγραφών που αφορούσαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια φορέων, με την αύξηση των συμμετεχόντων ώστε να εκπαιδευτούν περισσότεροι Επιχειρηματίες Τουρισμού. Επιπρόσθετα αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα που αφορούσαν την υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών για την μελέτη, επιλογή και σήμανση θέσεων τουριστικού ενδιαφέροντος μνημείων και χώρων θρησκευτικού – πολιτιστικού τουρισμού καθώς διαγωνιστική διαδικασία ήταν άγονη.

Με το πέρας των παρουσιάσεων προόδου έγινε συζήτηση γύρω από τα χρονοδιαγράμματα του έργου καθώς και παρατηρήσεις και εισηγήσεις από την διαχειριστική αρχή. Ακολούθησε συζήτηση γύρω από τις εκκρεμότητες και τον συντονισμό του εταιρικού σχήματος, όπως η υπογραφή της αναθεωρημένης ΣΕΣ και η επικαιροποίηση του ΤΔΕ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για θέματα βιωσιμότητας των εκροών και αποτελεσμάτων του έργου.

3.1.7 Παρουσίαση του Υπουργείου στην 5<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση

17 Μαρτίου 2022, Λεμεσός

RE-CULT

5<sup>η</sup> ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



## Πρόσδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

<b>Σύμβαση 1</b> Απ' ευθείας ανάθεση Συνολικός π/υ διαγωνισμού: 9.475,80€ (11.750,00€ με ΦΠΑ) Κατακυρωθείσα δαπάνη: 10.416,00€ με ΦΠΑ)	1.2.2 Τεχνικές Συναντήσεις
	1.2.3 Διαχείριση και συντονισμός έργου
	2.2.3 Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη

Υπό υλοποίηση.

 ΔΕΣΜΟΙ  
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

<p>Σύμβαση 2 Απ' ευθείας ανάθεση Συνολικός π/υ διαγωνισμού: 1.209,68€ (1.500,00€ με ΦΠΑ)</p>	<p>1.2.4 Εξακρίβωση δαπανών από ανεξάρτητο ελεγκτικό γραφείο, π/υ 1.500€  (Μήνες 1-36)</p>
--	--

Υπογραφή σύμβασης: 04.2021

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος φυσικού αντικειμένου

- Έκδοση του 1<sup>ου</sup> πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο αναφοράς 01/10/2018 - 10/09/2021 (ποσό 21.284,52€)
- Υποβολή αιτήματος για την 2<sup>η</sup> διοικητική επαλήθευση δαπανών (ποσό 24.712,00€)
- Ποσοστό υλοποίησης:
  - ❖ 80,06% επί των συμβασιοποιημένων
  - ❖ 56,88% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

**Σύμβαση 4**  
Συνοπτικός  
διαγωνισμός

Συνολικός π/υ:  
43.548,39€  
(54.000,00 € με ΦΠΑ)

Κατακυρωθείσα  
δαπάνη: 33.480,00€  
με ΦΠΑ)

2.2.1 Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Ελλάδα

3.2.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

3.2.2 Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας

2.2.1 Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση της εκδήλωσης.

3.2.1 Ολοκληρώθηκε

3.2.2 Ολοκληρώθηκε

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος φυσικού αντικειμένου

### Π2.2.1:

- Η αρχική εκδήλωση για το Π2.2.1 διοργανώθηκε στην Κρήτη στις 28 Σεπτεμβρίου 2021.

### Π3.2.2:

- Ολοκλήρωση διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.
- Διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας στη Ρόδο στις 22/07/2021.
- Οριστικοποίηση μνημονίου συνεργασίας και υπογραφή από ενδιαφερόμενους φορείς.

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ευχαριστώ πολύ

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

## 3.1.8 Ημερήσια διάταξη της 6ης Τεχνικής Συνάντησης




Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

Πρόγραμμα 6ης Τεχνικής Συνάντησης, Μυτιλήνη



<http://www.recult-greece-cyprus.eu>

 ReCult Interreg VA Greece/Cyprus

**Πέμπτη, 01/09/2022** – Αίθουσα Β15, Γ' όροφος, κτήριο Γεωγραφίας  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαδικτυακό link:

<https://aegean-gr.zoom.us/j/6837650883?pwd=UHdhUjdKQTlVbM3ZaZlNUOU1taIR6QT09>

10:00 – 14:00	6 <sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση Έργου	Όλοι οι εταίροι
10:00 – 12:00	<b>Πρώτο μέρος – Ενημέρωση προόδου από εταίρους</b>	
10:00 – 10:15	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου (Κεντρικός Δικαιούχος)	Εκπρόσωπος Εταίρου (ΚΔ)
10:15 – 10:30	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Υπουργείου Τουρισμού Ελλάδος (Δ2)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ2)
10:30 – 10:45	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (Δ3)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ3)
10:45 – 11:00	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Εκκλησίας της Ελλάδος (Δ4)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ4)
11:00 – 11:15	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Δ5)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ5)
11:15 – 11:30	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Δ6)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ6)

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



11:30 – 11:45	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δ7)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ7)
11:45 – 12:00	Ενημέρωση για πρόοδο Έργου από Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Δ8)	Εκπρόσωπος Εταίρου (Δ8)
12:00 – 12:30	<b>Διάλειμμα</b>	
12:30 – 14:00	<b>Δεύτερο μέρος – Συζήτηση</b>	
12:30 – 14:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενημέρωση για το συνέδριο</li> <li>• Ενημέρωση για πιστοποίηση δαπανών</li> <li>• Ενημέρωση για διαγωνισμούς</li> <li>• Τεχνικές εκθέσεις εξαμήνου</li> <li>• Μνημόνιο Συνεργασίας και επόμενες δράσεις</li> </ul>	Όλοι οι εταίροι

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



### 3.1.9 Πρακτικά της 6ης Τεχνικής Συνάντησης



# ΠΡΑΚΤΙΚΑ

## 6ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ RESULT

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/09/2022, ΜΥΤΙΛΗΝΗ**

**ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λόφος Πανεπιστημίου, κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, 81100**

Zoom link για συμμετέχοντες διαδικτυακά:

<https://aegean-gr.zoom.us/j/6837650883?pwd=UHdhUjdKQTlvM3ZaZlNUOU1taIR6QT09>

### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

- ΚΔ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κύπρος)
- Δ2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ελλάδα)
- Δ3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)
- Δ4 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελλάδα)
- Δ5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)
- Δ6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ελλάδα)
- Δ7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος)
- Δ8 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (Ελλάδα)



# ΠΡΑΚΤΙΚΑ

## 6<sup>ης</sup> ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ RE-CULT 01/02/2022, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Την Πέμπτη 01/09/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 6<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση του έργου RE-CULT για την Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Η συνάντηση έλαβε μέρος υβριδικά στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη αλλά και με σύνδεσμο zoom για εκπροσώπους των εταίρων που δεν παραβρέθηκαν στην αίθουσα. Υπήρχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου.





Δια ζώσης συμμετείχαν οι φορείς: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κύπρος), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ελλάδα), ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΛΚΕ (Ελλάδα), ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος) και ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (Ελλάδα)



Διαδικτυακά συμμετείχαν οι φορείς: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελλάδα) και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος).

Στη συνάντηση παραβρέθηκε διαδικτυακά και ο κ. Αστέριος Φυλάτος εκ μέρους της ΚτΓ.

Για την πλήρη λίστα συμμετεχόντων βλ. λίστα συμμετεχόντων 6<sup>ης</sup> τεχνικής συνάντησης

Η Τεχνική Συνάντηση διαρθρώθηκε σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης από όλους τους εταίρους. Συγκεκριμένα:

Η Συνάντηση ξεκίνησε με την ενημέρωση του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου (ΚΔ) από την κα. Όλγα Θεοχάρους και τον κ. Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου, οπότε και συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν στην παρακολούθηση του έργου, όπως και της πορείας συλλογής υπογραφών του ΣΕΣ, κατόπιν των αλλαγών που έχουν γίνει.

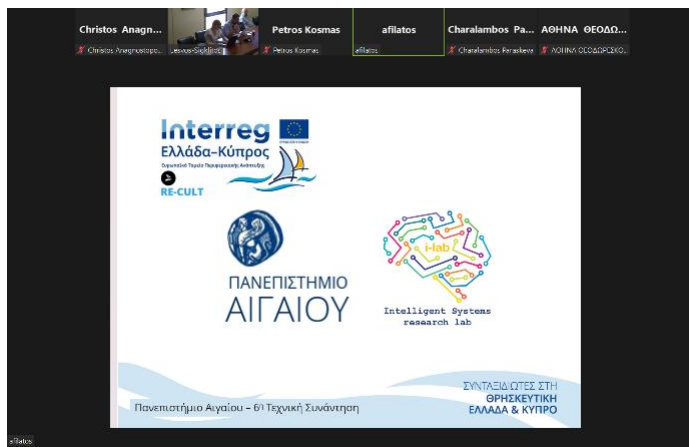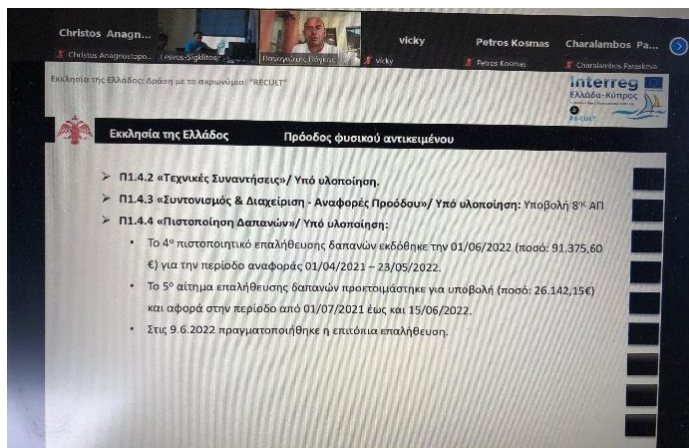

Ακολούθησε η παρουσίαση του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδος από την κα. Ευαγγελία Ιωσήφ που παρουσίασε εν συντομία τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στον φορέα, καθώς και τις δράσεις που εκπορεύτηκαν από αυτά.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου από τους εκπροσώπους που συμμετείχαν στη Συνάντηση για την ψηφιοποίηση πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στην Κύπρο που έγινε στα πλαίσια της Πράξης και ότι το έργο «κλείνει» ομαλά. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Βασίλειο Δρακονάκη που επικέντρωσε μεταξύ άλλων στις δράσεις ψηφιοποίησης υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε θέματα εργαστηρίου, εξοπλισμού, αλλά και κάποια ζητήματα που αντιμετώπισε κατά την διαδικασία ψηφιοποιήσεων.

Κατόπιν, για την Εκκλησία της Ελλάδος, συνδέθηκε ο εκπρόσωπος της κ. Παναγιώτης Πόγκας όπου παρουσίασε το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στο φορέα, τα παραδοτέα που πραγματοποιήθηκαν, τις επαληθεύσεις καθώς και αυτά που ολοκληρώνονται (e-book). Ακολούθως απάντησε σε διαδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία υπογραφών της ΣΕΣ, παραδοτέων της ΕΚ και συμβασιοποιήσεων του Φορέα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των παραδοτέων του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου από την κα. Χρυσάιμιλη Ψιλογέννη και τον κ. Ιωάννη Χαραλάμπους, σύμβουλο του ΣΤΕΚ στο έργο.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των παραδοτέων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΕΛΚΕ από τον Καθηγητή Χ.Ν. Αναγνωστόπουλο, όπου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα παραδοτέα που αφορούν στη ψηφιοποίηση Θρησκευτικής Κληρονομιάς (υλικής και άυλης), καθώς και

σχετικά σχόλια σχετικά με καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση της Πράξεως, ιδιαίτερα στην άυλη κληρονομιά.

Στη συνέχεια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε εν συντομία τα παραδοτέα του φορέα, με κύρια έμφαση σε εφαρμογές της πλατφόρμα γεωπληροφορικής ΜΙΤΟΣ (διαδρομές θρησκευτικού τουρισμού) αλλά και σε δράσεις επαυξημένης πραγματικότητας παρουσιάζοντας demos αντίστοιχων εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Την παρουσίαση ανέλαβε να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως ο κ. Χρήστος Αντρέεβ και ο Καθηγητής κ. Πέτρος Κοσμάς.

Τέλος, οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση της προόδου της Πράξεως από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ι.Μ. Σύρου, από τον κ. Νικόλαο Χρυσίνη με αναφορά στην πρόοδο του έργου ανά παραδοτέο και την καταγραφή των τουριστικών πόρων στις Κυκλάδες και στην Κύπρο και στην ανάπτυξη θεματικών τουριστικών πακέτων θρησκευτικού τουρισμού. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην προμήθεια στην προμήθεια και εγκατάσταση των συσκευών ολογραφικής προβολής που σχετίζεται με την ολοκλήρωση του σχετικού παραδοτέου.

Μετά το διάλειμμα, ακολούθησε το δεύτερο μέρος της Τεχνικής Συνάντησης με θέματα διαχειριστικής φύσεως με σκοπό το ομαλό κλείσιμο της Πράξεως RECULT. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κεντρικός Δικαιούχος (ΚΔ) και τα θέματα που συζητήθηκαν/αναδείχθηκαν ήταν τα εξής:

- Ενημέρωση για το συνέδριο Θρησκευτικής Κληρονομιάς (την επόμενη μέρα της 6<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης)
- Ενημέρωση για πιστοποίηση δαπανών των φορέων
- Εκκρεμότητες διαγωνιστικών διαδικασιών και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης

- Συντονισμός και ενημέρωση για τη διαδικασία συλλογής υπογραφών ΣΕΣ και Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει εκκρεμούν
- Συλλογή παραδοτέων από όλους τους εταίρους και προβολή τους (με όποιο πρόσφορο τρόπο) στην ιστοσελίδα της Πράξεως.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο κ. Αστέριος Φυλάτος από την ΚτΓ.

Με τη λήξη της 6<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης οι εταίροι δεσμεύτηκαν να εντείνουν τις δράσεις και ενέργειες που υπολείπονται για την αποτελεσματική λήξη της Πράξεως RECULT, όπως και η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή της αναθεωρημένης ΣΕΣ που εκκρεμεί.



### 3.1.10 Λίστα συμμετεχόντων στην 6<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση



Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου



**Παρουσιολόγιο 6<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης**  
**Πέμπτη 01/09/22, Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, κτ. Γεωγραφίας, αίθ. Β15**

α/α	Όνοματεπώνυμο	Δικαιούχος	Υπογραφή
1	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΜΟΝΑΗΣ	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	
2	Κωσταντίνος Μουλατσός	ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ	
3	Χρύσα Γιαννιόδου	ΠΡΟΩΠΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε	
4	Αντών Γιαννιόδου	-/-	



Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

5	Όλια Ελοκάρου	Υπουργείο Τουρισμού	
6	Χρυσόστομος Παπαχρυσόστομος	Υπουργείο Τουρισμού Κύπρου	
7	Χρύση Νικη	ΚΕΑ Σ.Μ. ΣΥΠΟΧ	
8	Πολυκατέρια Μανιώτης	ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΧ	
9	Γεωργία Ευαγγελία	Υπουργείο Τουρισμού	
10	Γωγίτης Χαράλαμπος	ΣΤΕΚ	
11	Γεωργία Φαροχίμ	ΣΤΕΚ	
12	Πρόδρομος Βαλαζουρίδης	ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΧ	
13	Δημήτριος Βεργαδός	Π. Αιγαίου	
14	Χάρις Νικ. Αποστολίδου	Π. Αιγαίου	



Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

15	Παναγιώτης Πόρχος	Εκκλήσιο της Ελλάδος	Διοικητική υπηρεσία
16	Πέτρος Κορμής	ΤΕΠΑΚ	>>
17	Βίκυ Στράμω	Υπ. Τουρισμού	>>
18	Χαράλαμπος Παροσκενά	Ι.Α.Κ.	>>
19	Αθηνά Θεοδωρέσκου	Σ.Τ.Ε.Κ.	>>
20	Κωνσταντίνος Κώτης	Παν. Αγιάου	
21	Αστέρας Φυλάκας	ΚΙΤ	Διοικητική υπηρεσία
22	Χαράλαμπος Χαράλαμους	Ι.Α.Κ	
23	Π. Σαββας Χατζηιωανν	Ι.Α.Κ	
24	Τομσαρί Νερέβα	Ε.Α.Κ.	

3.1.11 Παρουσίαση του Υπουργείου στην 6<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση

## 1 Σεπτεμβρίου 2022, Μυτιλήνη

### RE-CULT

### 6<sup>η</sup> ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



## Πρόοδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

<b>Σύμβαση 1</b> <b>Απ' ευθείας ανάθεση</b> <b>Συνολικός π/υ</b> <b>διαγωνισμού: 9.475,80€</b> <b>(11.750,00€ με ΦΠΑ)</b> <b>Κατακυρωθείσα</b> <b>δαπάνη: 10.416,00€ με</b> <b>ΦΠΑ)</b>	1.2.2 Τεχνικές Συναντήσεις
	1.2.3 Διαχείριση και συντονισμός έργου
	2.2.3 Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη

Υπό υλοποίηση.

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόοδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

<p><b>Σύμβαση 2</b> Απ' ευθείας ανάθεση Συνολικός π/υ διαγωνισμού: 1.209,68€ (1.500,00€ με ΦΠΑ)</p>	<p>1.2.4 Εξακρίβωση δαπανών από ανεξάρτητο ελεγκτικό γραφείο, π/υ 1.500€  (Μήνες: 1-36)  <b>Υπογραφή σύμβασης: 04.2021</b></p>
---	--

- Έκδοση του 1<sup>ου</sup> πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο αναφοράς 01/10/2018 - 10/09/2021 (ποσό 21.284,52€)
- Έκδοση του 2<sup>ου</sup> πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο αναφοράς 01/06/2021 - 31/12/2021 (ποσό 20.372,00€)

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόοδος χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών

<p><b>Σύμβαση 4</b> Συνοπτικός διαγωνισμός  Συνολικός π/υ: 43.548,39€ (54.000,00 € με ΦΠΑ)  Κατακυρωθείσα δαπάνη: 33.480,00€ με ΦΠΑ)</p>	<p>2.2.1 Υλοποίηση αρχικής εκδήλωσης στην Κρήτη. Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Ελλάδα</p>
	<p>3.2.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου</p>
	<p>3.2.2 Διενέργεια διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερομένων μερών (στρογγυλής τράπεζας) στην Ελλάδα (Σύρο) για τη διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών. Καταγραφή προτάσεων και Διοργάνωση Κοινής Στρογγυλής Τράπεζας (Ρόδο) και Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας</p>

2.2.1 Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση της εκδήλωσης

3.2.1 Ολοκληρώθηκε

3.2.2 Ολοκλήρωση διαβούλευσης με φορείς και  
ενδιαφερόμενα μέρη

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος φυσικού αντικειμένου

### Π3.2.2:

- Οριστικοποίηση μνημονίου συνεργασίας & υπογραφή από ενδιαφερόμενους φορείς
- Υιοθέτηση μνημονίου συνεργασίας



ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## Πρόδος οικονομικού αντικειμένου

ΔΖ ΥΠΟ ΥΨ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ			ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Π/Υ			ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ			ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
	Δαπάνες Μετακίνησης	Εξωτερική Εμπλοκή γυν.	Υποσύνολο	Δαπάνες Μετακίνησης	Εξωτερική Εμπλοκή γυν.	Υποσύνολο	Δαπάνες Μετακίνησης	Εξωτερική Εμπλοκή γυν.	Υποσύνολο	Δαπάνες Μετακίνησης	Εξωτερική Εμπλοκή γυν.	Υποσύνολο
ΠΕ1	4.350,00 €	11.500,00 €	15.850,00 €	4.536,00 €	10.366,00 €	14.902,00 €	1.841,00 €	6.383,52 €	8.224,52 €	1.841,00 €	6.383,52 €	8.224,52 €
1.2.2	4.350,00 €	2.000,00 €	6.350,00 €	4.536,00 €	1.773,20 €	5.909,20 €	1.841,00 €	-	1.841,00 €	1.841,00 €	-	1.841,00 €
1.2.3	-	8.000,00 €	8.000,00 €	-	7.092,80 €	7.092,80 €	-	6.383,52 €	6.383,52 €	-	6.383,52 €	6.383,52 €
1.2.4	-	1.500,00 €	1.500,00 €	-	1.500,00 €	1.500,00 €	-	-	-	-	-	-
ΠΕ2	3.680,00 €	13.750,00 €	17.430,00 €	3.514,00 €	9.340,00 €	12.854,00 €	1.521,00 €	7.790,00 €	9.311,00 €	1.521,00 €	3.450,00 €	4.971,00 €
2.2.1	2.900,00 €	7.000,00 €	9.900,00 €	2.794,00 €	4.340,00 €	7.074,00 €	1.521,00 €	4.340,00 €	5.861,00 €	1.521,00 €	3.450,00 €	4.971,00 €
2.2.2	-	5.000,00 €	5.000,00 €	-	3.450,00 €	3.450,00 €	-	3.450,00 €	3.450,00 €	-	-	-
2.2.3	780,00 €	1.750,00 €	2.530,00 €	780,00 €	1.550,00 €	2.330,00 €	-	-	-	-	-	-
ΠΕ3	580,00 €	47.000,00 €	47.580,00 €	560,00 €	29.140,00 €	30.100,00 €	902,00 €	27.559,00 €	28.461,00 €	902,00 €	27.559,00 €	28.461,00 €
3.2.1	17.000,00 €	17.000,00 €	34.000,00 €	17.000,00 €	10.540,00 €	27.540,00 €	902,00 €	8.959,00 €	8.959,00 €	902,00 €	8.959,00 €	8.959,00 €
3.2.2	580,00 €	30.000,00 €	30.580,00 €	560,00 €	18.600,00 €	19.560,00 €	902,00 €	18.600,00 €	19.502,00 €	902,00 €	18.600,00 €	19.502,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.610,00 €</b>	<b>72.250,00 €</b>	<b>80.860,00 €</b>	<b>8.610,00 €</b>	<b>48.846,00 €</b>	<b>57.456,00 €</b>	<b>4.264,00 €</b>	<b>41.732,52 €</b>	<b>46.996,52 €</b>	<b>4.264,00 €</b>	<b>37.392,52 €</b>	<b>41.656,52 €</b>

- ✓ Σύνολο επαληθευμένων δαπανών επί των συμβασιολογημένων : **72%**
- ✓ Σύνολο δαπανών που εξοφλήθηκαν επί των συμβασιολογημένων : **80%**
- ✓ Σύνολο δαπανών που εξοφλήθηκαν επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού : **57%**



ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ευχαριστώ πολύ

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



## 3.2 Σχέδιο τροποποίησης σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Αριθμ. 50

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/09.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005534254 2019-09-09) ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της με αριθμ. 2/09.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005534254 2019-09-09) σύμβασης για την διαχείριση τον συντονισμό και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» και ακρωνύμιο «RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Στην Αθήνα σήμερα,                    στο κτήριο επί της οδού Αμαλίας 12 στο Σύνταγμα, στο οποίο εδρεύει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Το **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**, το οποίο εδρεύει στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12, ΤΚ 105 57 Αθήνα, με Α.Φ.Μ.: 997417873, Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Υπηρεσιακή Γραμματέα, Σταυρούλα Μηλιάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5157/24-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 222) και εφεξής καλείται χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή»
2. Η **εταιρεία** με την επωνυμία «**ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «ΓΝΩΣΗ Ι.Κ.Ε.», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Καραολή - Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά και ΑΦΜ: 999922418, ΔΟΥ: Καλαμαριάς, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τη Διαχειρίστρια κ. Ζωή Βαδράτσικα που θα καλείται στη σύμβαση αυτή «Ανάδοχος»

Αφού έλαβαν υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ. 13155/05.07.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΑΣΣ465ΧΘΟ-ΑΗΟ, ΑΔΑΜ:19AWRD005240083 2019-07-08) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020»
2. Την με αριθμ. 2/09.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005534254 2019-09-09) σύμβαση για την διαχείριση και τον συντονισμό και την υλοποίηση της πράξης: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020» μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της εταιρείας με επωνυμία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».
3. Το υπ' αριθμ. 17126/28.9.2021 αίτημα παράτασης σύμβασης για την διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη το από 9.9.2021 αίτημα παράτασης υλοποίησης της πράξης που υποβλήθηκε από τον Κύριο Δικαιούχο του έργου προς την Διαχειριστική Αρχή.
4. Το από 14.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Διαχειριστική Αρχή περί έγκρισης 12μηνης παράτασης του έργου, ήτοι, έως 30.9.2022.
5. Την με αριθμ. 21606/1.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21AWRD009649944 2021-12-02) απόφαση τροποποίησης της με αριθμ. 2/09.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005534254 2019-09-09) σύμβασης για την διαχείριση τον συντονισμό και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» και ακρωνύμιο “RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

**Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:**

**Α Ρ Θ Ρ Ο Μ Ο Ν Ο**

A. Την τροποποίηση του άρθρου 3 της με αριθμ. 2/09.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005534254 2019-09-09) σύμβασης για την διαχείριση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της εταιρείας με επωνυμία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ» όσον αφορά στον χρόνο λήξης της Σύμβασης, ήτοι, από «30.9.2021» σε «30.9.2022».

B. Την τροποποίηση του σημείου (στ) του άρθρου 7 της ως άνω σύμβασης ως εξής:

«στ. Το 10% της αξίας του παραδοτέου «1.2.3 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου» με την οριστική παραλαβή από την ΕΠΠ της τελικής εξαμηνιαίας έκθεσης του έργου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 2/09.09.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005534254 2019-09-09) σύμβαση.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, από τα οποία έλαβε δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ**

**ΖΩΗ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ**

### 3.3 1<sup>ο</sup> πιστοποιητικό επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο από 01/10/2018 έως 10/09/2021



#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Στοιχεία Έργου	
Όνομασία Προγράμματος INTERREG	21-Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Τίτλος έργου	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
Ακρωνύμιο έργου	RE -CULT
Κωδικός MIS	5035557
Περίοδος αναφοράς	01/10/2018 -10/09/2021
Επικεφαλής δικαιούχος	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αύξων αριθμός επαλήθευσης	161575
2. Δικαιούχος	
Ελεγχόμενος Δικαιούχος	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συμμετοχή δικαιούχου στο έργο (Επικεφαλής, απλός)	Εταίρος

Με βάση τα έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεσή μου και την επαγγελματική μου κρίση ως επαληθευτής - ελεγκτής, βεβαιώνω ότι όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα Επαληθευμένων Δαπανών έχουν καταβληθεί από τον δικαιούχο σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις του Άρθρου 125 του Κανονισμού 1303/2013, του Άρθρου 18 του Κανονισμού 1299/2013 και τον Κανονισμό 481/2014, όπως αυτοί ισχύουν
- Τους κανόνες επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τους σχετικούς εθνικούς κανόνες
- Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης

και ειδικότερα :

- Η επαληθευμένη δαπάνη έχει πληρωθεί και έχει εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες εντός της επιλέξιμης περιόδου.
- Τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα έχουν πραγματοποιηθεί και τα αντίστοιχα παραδοτέα έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδότησης και την ενδεδειγμένη Αίτηση Χρηματοδότησης.
- Οι υπηρεσίες, προμήθειες και έργα έχουν συμβασιοποιηθεί σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες δημοσίων συμβάσεων και τους σχετικούς εθνικούς κανόνες.
- Παράτυπη δαπάνη, τόκος που εισπράχθηκε και έσοδα έχουν επιστραφεί και αφαιρεθεί από την επιλέξιμη δαπάνη.
- Δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση της επαληθευμένης δαπάνης από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.
- Η συνημμένη Λίστα Ελέγχου Επαληθεύσεων είναι ακριβής και βασισμένη σε αξιόπιστα λογιστικά έγγραφα και σε επαληθεύσιμα έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
- Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις πολιτικές συμπεριλαμβανομένων δημοσιότητας, ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, προστασία περιβάλλοντος,

κρατικές ενισχύσεις, διαφανείς διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων.

3. Επαλήθευση			
Μέθοδος επαλήθευσης	διοικητική επαλήθευση	<input checked="" type="checkbox"/>	επιτόπια επαλήθευση
Ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης			
Ποσό που επαληθεύτηκε	Συνολικό επαληθευθέν ποσό	Συνεισφορά της ΕΕ σε EUR	Εθνική συμμετοχή
	21.284,52	18.091,84	3.192,68

Οι διενεργήσαντες την επαλήθευση	
Ημερομηνία	25.10.2021
Όνοματεπώνυμο	ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΣΣΑΚΗΣ



ΠΡΑΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΦΜ : 990751307  
ΤΗΛ : 6978809226

### 3.4 2<sup>ο</sup> πιστοποιητικό επαλήθευσης δαπανών για την περίοδο από 01/06/2021 έως 31/12/2021



#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Στοιχεία Έργου	
Όνομασία Προγράμματος INTERREG	21-Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Τίτλος έργου	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
Ακρωνύμιο έργου	RE -CULT
Κωδικός MIS	5035557
Περίοδος αναφοράς	01/06/2021 -31/12/2021
Επικεφαλής δικαιούχος	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αύξων αριθμός επαλήθευσης	279295
2. Δικαιούχος	
Ελεγχόμενος Δικαιούχος	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συμμετοχή δικαιούχου στο έργο (Επικεφαλής, απλός)	Εταίρος

Με βάση τα έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεση μου και την επαγγελματική μου κρίση ως επαληθευτής - ελεγκτής, βεβαιώνω ότι όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα Επαληθευμένων Δαπανών έχουν καταβληθεί από τον δικαιούχο σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις του Άρθρου 125 του Κανονισμού 1303/2013, του Άρθρου 18 του Κανονισμού 1299/2013 και τον Κανονισμό 481/2014, όπως αυτοί ισχύουν
- Τους κανόνες επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τους σχετικούς εθνικούς κανόνες
- Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης

και ειδικότερα :

- Η επαληθευμένη δαπάνη έχει πληρωθεί και έχει εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες εντός της επιλέξιμης περιόδου.
- Τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα έχουν πραγματοποιηθεί και τα αντίστοιχα παραδοτέα έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδότησης και τη συγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης.
- Οι υπηρεσίες, προμήθειες και έργα έχουν συμβασιοποιηθεί σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες δημοσίων συμβάσεων και τους σχετικούς εθνικούς κανόνες.
- Παράτυπη δαπάνη, τόκος που εισπράχθηκε και έσοδα έχουν επιστραφεί και αφαιρεθεί από την επιλέξιμη δαπάνη.
- Δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση της επαληθευμένης δαπάνης από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.
- Η συνημμένη Λίστα Ελέγχου Επαληθεύσεων είναι ακριβής και βασισμένη σε αξιόπιστα λογιστικά έγγραφα και σε επαληθεύσιμα έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
- Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις πολιτικές συμπεριλαμβανομένων δημοσιότητας, ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, προστασία περιβάλλοντος,



κρατικές ενισχύσεις, διαφανείς διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων.

3. Επαλήθευση			
Μέθοδος επαλήθευσης	διοικητική επαλήθευση	[x]	επιτόκια επαλήθευση
Ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης			
Ποσό που επαληθεύτηκε	Συνολικό επαληθευθέν ποσό	Συνεισφορά της ΕΕ σε EUR	Εθνική συμμετοχή
	20.372,00	17.316,20	3.055,80

Οι διενεργήσαντες την επαλήθευση	
Ημερομηνία	29/06/2022
Όνοματεπώνυμο	ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΣΣΑΚΗΣ

  
ΠΡΑΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΦΜ: 100763307  
ΤΗΛ: 6978609220

### 3.5 6<sup>η</sup> Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

  	Α/Α Έκθεσης Προόδου: 6 Ημερομηνία Υποβολής: 13/7/2021 Κωδικός MIS: 5035557 Αρ.Πρωτ./Ημερομηνία:
(συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Ετήσιο)	
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A</b> <b>ΕΛΛΑΔΑ -ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020</b> <b>ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ</b> Η προστασία του αρχείου excel δεν πρέπει να καταργηθεί.	
Η αναφορά πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά και με e-mail στη διεύθυνση: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" Κοινή Γραμματεία "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020" Balkan Center, Κτήριο Δ. 2ος Ανελκυστήρας, 3ος όροφος 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 570 01, Πυλαία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Tel.: +30 2310 024060 Fax: +30 2310 024078 E-mail: jts_grcy@inou.gr	
<b>Τίτλος έργου</b>	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
<b>Ακρωνύμιο Έργου</b>	Re-Cult

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΣΕΙΣ			
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	3. Διερεύνηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων		
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	6 Αισιόληξη και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της αποδοτικότητας των πόρων		
ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	6c. Διερεύνηση, προστασία, πρόληψη και ανάκτηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	3.2 Βελτίωση της κλιμακωπότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.		
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου		
ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ	Re-Cult		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΘΗΣ ΚΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		
A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΣΥΝΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞ)
Κατ. Δικ. (A.1)	Υπουργείο Τουρισμού ΚΑ	Κύπρος	106.663,00 €
Δ2	Υπουργείο Τουρισμού	Ελλάδα	80.860,00 €
Δ3	Ιατρ. Αρχαιολογική Κύπρου	Ελλάδα	300.827,50 €
Δ4	Εκλόγιος της Ελλάδας	Ελλάδα	310.000,00 €
Δ5	Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου	Κύπρος	290.000,00 €
Δ6	Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Αναπτυξιακός Έργων	Ελλάδα	240.000,00 €
Δ7	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	Ελλάδα	315.000,00 €
Δ8	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιατρ. Νηρολογίας Έλλας	Κύπρος	195.000,00 €
Δ9			
Δ10			
ΣΥΝΟΛΟ			1.918.370,50 €
Μητρώος Εκπρόσωπος	Όνομα: Θεοδόσης Οδυσσέας Θέση στον φορέα: Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση: Κεραυρός Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3736347 E-mail: [ΦΩΣ]	210 3736136	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Υποθέτης Έργου	Όνομα: Νικόλαος Αναστασοπούλου Θέση στον φορέα: Υπηρεσία του Υπουργείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιχορήγησης Διεύθυνση: Κεραυρός Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3736119 E-mail: [ΦΩΣ]	210 3736136	
Οικονομικός Υποθέτης	Όνομα: Παγγελία Καλαμαροπούλου Θέση στον φορέα: Πάλλης και Ελεφάντης Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Κεραυρός Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3736340 E-mail: [ΦΩΣ]	210 3736136	
Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νέμου εκπρόσωπου, του υπεύθυνου Έργου ή του οικονομικού υπεύθυνου παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα νέα στοιχεία			
Περίοδος Αναφοράς	Έναρξη	1/1/2021	Λήξη 30/6/2021
Διάρκεια Έργου	Έναρξη	1/10/2018	Λήξη 30/9/2021 Διάρκεια 36,8

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΩΔΟΥ	
<p><b>2.1 Περιλήψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα</b>                      Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αμπερία που αποκτήθηκε και η προπρωθυμία οδία της συνεργασίας.                      Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 2000                      Παρακαλείσθε να μην υπερβείτε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί</p>	<p>Αριθμός χαρακτήρων 1845</p>
<p>Από την έναρξη του έργου έως σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού έκανε όλες τις προοπτούμενες διοικητικές ενέργειες, για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ροής του έργου και την αρχική υλοποίησή του. Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε μέσω των εκπροσώπων του στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Λευκωσία στις 15.02.2019, στη 3η τεχνική συνάντηση στις 04.10.2019 στη Σύρο και στην 3η τεχνική συνάντηση στις 27.02.2020 στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας τη συμμετοχή του στο έργο, τον προβλεπόμενο τρόπο υλοποίησης, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και το χρονοδιάγραμμα των αναθέσεων (Π1.2.2). Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης υποβολής προφορών για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου, το Υπουργείο Τουρισμού υπέγραψε στις 09.09.19 σύμβαση συνεργασίας με Τεχνικό Σύμβουλο (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.3).</p> <p>Στις 11.11.2019 το Υπ. Τουρισμού υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία για την παραγωγή «Ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής» κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πρόσκλησης υποβολής προφορών (Π2.2.2). Στις 13.11.2020 το Υπουργείο Τουρισμού παρέλαβε το σύνολο του Παραδοτέου. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Διακήρυξης στις 18.09.2019 για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» (Παραδοτέα 2.2.1, 3.2.1, 3.2.2), το Υπ. Τουρισμού υπέγραψε στις 16.03.2020 σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία. Η σύμβαση επικυρώθηκε έως τις 30.09.2021, λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID-19. Συγκεκριμένα, μετατίθεται η ημερομηνία παράδοσης του Π2.2.1 για 30.09.2021 και του Π3.2.2 για 31.07.2021. Ολοκληρώθηκε η παραγωγή υλικού πληροφόρησης και προβολής (Π2.2.2). Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και θεσμικής ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού σε διαδικτυακή διαβούλευση την 11/09/2020.</p>	
<p><b>2.2 Περιλήψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</b>                      Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς.                      Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500</p>	<p>Αριθμός χαρακτήρων 375</p>
<p>* Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση του έργου η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23/04/2021 (Παραδοτέο 1.2.2).</p> <p>* Οριστική παραλαβή του παραδοτέου 3.2.1 Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού</p> <p>* Προγραμματισμός των ενεργειών για την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.2.2. Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.</p>	

<p><b>2.3 Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.</b>                      Παρακαλείσθε να παρασχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων.                      Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 4000                      Παρακαλείσθε να μην υπερβείτε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί</p>	<p>Αριθμός Χαρακτήρων 747</p>
<p>* Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση του έργου η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23/04/2021 (Παραδοτέο 1.2.2).</p> <p>* Οριστική παραλαβή του παραδοτέου 3.2.1 Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού. Λόγω ελλείψεων στο παραδοτέο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι μέρος των δραστηριοτήτων έγινε διαδικτυακά λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του covid, ο δικαιούχος επέβαλε μείωση στην αξία του παραδοτέου κατά 15%.</p> <p>* Προγραμματισμός των ενεργειών για την ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.2.2. Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη. Προγραμματίστηκε η υλοποίηση της εκδήλωσης στη Ρόδο στις 22/07/2021 και οι ενέργειες για την προκαταρκτική διαβούλευση στις αρχές Ιουλίου 2021.</p>	
<p> </p>	
<p> </p>	
<p> </p>	

**2.4 Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου**  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός Χαρακτήρων 551

1. Υποβολή 1ου απήματος για την διοικητική επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο 1.2.4).  
 2. Διοργάνωση της Αρχικής Εκδήλωσης στην Κρήτη την 30.09.2021 (Παραδοτέο 2.2.1).  
 3. Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη στις 12 και 13 Ιουλίου 2021 (Παραδοτέο 3.2.2) και διοργάνωση της στρωγυλής τράπεζας για την παρουσίαση του μηνιαίου συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε θέματα ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού στις 22/7/2021 και ολοκλήρωση Παραδοτέου 3.2.2 «Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη».

**2.5 Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις**  
 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός χαρακτήρων 472

Ο Δικαιούχος απήγαγε τον ορισμό επαληθευτή - ελεγκτή στη Μονάδα Γ της Διαχειριστικής Αρχής. Στις 14/04/2021 υποδείχθηκαν τρεις υποψήφιοι. Στις 22/04/2021 εκδόθηκε απόφαση αναθεσης για την ανασήλη των υπηρεσιών στον επιλεγμένο υποψήφιο. Ο ελεγκτής πριν την υπογραφή της σύμβασης υπέβαλε αίτημα παραιτήσης καθώς έχει ασυμβίβαστο στην εκτέλεση των υπηρεσιών του. Έπειτα από επικοινωνία με τη Μονάδα Γ, αποφασίστηκε να οριστεί ένας εκ των δυο υποψηφίων που είχαν υποδειχθεί.

**2.6 Αλλαγές στην Υλοποίηση**  
 Παρακολούθησε να δηλωθείτε οποιαδήποτε αλλαγή προτίθεστε να κάνετε σε σχέση με την εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να τηρεί αυστηρά τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Σε κομιά περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές χωρίς τη γνώση και έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ για τις σημαντικές αλλαγές ενδέχεται να απαιτείται υποβολή ανασυζητημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου. Επιπλέον, οι σημαντικές αλλαγές/τροποποιήσεις του έργου ενδέχεται να απαιτούν και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στον ισχύοντα Οδηγό Έργου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  
 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός Χαρακτήρων 38

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην υλοποίηση

**ΕΝΟΤΗΤΑ 3- ΔΕΙΚΤΕΣ**

Κλίμαα Προστασιότητας	1. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
Θεματικός Στόχος	6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αειδοτικότητας των πόρων
Επινοητική προτεραιότητα	6α. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Εθνικός Στόχος	1.2 Βελτίωση της αειδοτικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

**3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ**

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εργαλείο ΤΔΕ)	Επιταχυντικός ή μη (τρέχουσας περιόδου)	Συνολική Επιταχυντικός Αθροιστική Τιμή
Αριθμός Τουριστών: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκεπτών σε υποστηρίξιμες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος	Επισκέψεις/ήμερο	2000,00		

**3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εργαλείο ΤΔΕ)	Επιταχυντικός ή μη (τρέχουσας περιόδου)	Συνολική Επιταχυντικός Αθροιστική Τιμή
Μεταβολή στις επίσημες δημοσιεύσεις σε τουριστικό απολίμωτο	επιτομή/ήμερο δημοσιεύσεις	1,00		

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 - ΣΥΝΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΗ ΑΣΦΑΛΩΣ**

4.1.1 **Κατάσταση Πρωτοκόπιο**  
 Πρωτοκόπιο για συλλογή και διακίνηση σπόρων και σπόγγων σπόρων ποικιλιών παραδοσιακών και τοπικών ειδών. Ο πίνακας του Πρωτοκόπιου με την κατάσταση σε όλες τις περιόδους είναι το Πρωτοκόπιο του Πρωτοκόπιου. Οι πληροφορίες από διαφορετικές περιόδους που αναφέρονται στον πίνακα παρατίθενται ως εξής:

Α/Α	Είδος	Ποσότητα	Ποσότητα Πρωτοκόπιου	Ποσότητα Πρωτοκόπιου	Ποσότητα σπόρων που τρέφονται σπορίδια	ΣΥΝΟΛΟ ποσότητας σπόρων που τρέφονται σπορίδια	Ποσότητα σπόρων που τρέφονται σπορίδια	ΣΥΝΟΛΟ ποσότητας σπόρων που τρέφονται σπορίδια
1.1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7	1	1	1	1	1	1	1	1
1.8	1	1	1	1	1	1	1	1
1.9	1	1	1	1	1	1	1	1
1.10	1	1	1	1	1	1	1	1
1.11	1	1	1	1	1	1	1	1
1.12	1	1	1	1	1	1	1	1
1.13	1	1	1	1	1	1	1	1
1.14	1	1	1	1	1	1	1	1
1.15	1	1	1	1	1	1	1	1
1.16	1	1	1	1	1	1	1	1
1.17	1	1	1	1	1	1	1	1
1.18	1	1	1	1	1	1	1	1
1.19	1	1	1	1	1	1	1	1
1.20	1	1	1	1	1	1	1	1
1.21	1	1	1	1	1	1	1	1
1.22	1	1	1	1	1	1	1	1
1.23	1	1	1	1	1	1	1	1
1.24	1	1	1	1	1	1	1	1
1.25	1	1	1	1	1	1	1	1
1.26	1	1	1	1	1	1	1	1
1.27	1	1	1	1	1	1	1	1
1.28	1	1	1	1	1	1	1	1
1.29	1	1	1	1	1	1	1	1
1.30	1	1	1	1	1	1	1	1
1.31	1	1	1	1	1	1	1	1
1.32	1	1	1	1	1	1	1	1
1.33	1	1	1	1	1	1	1	1
1.34	1	1	1	1	1	1	1	1
1.35	1	1	1	1	1	1	1	1
1.36	1	1	1	1	1	1	1	1
1.37	1	1	1	1	1	1	1	1
1.38	1	1	1	1	1	1	1	1
1.39	1	1	1	1	1	1	1	1
1.40	1	1	1	1	1	1	1	1
1.41	1	1	1	1	1	1	1	1
1.42	1	1	1	1	1	1	1	1
1.43	1	1	1	1	1	1	1	1
1.44	1	1	1	1	1	1	1	1
1.45	1	1	1	1	1	1	1	1
1.46	1	1	1	1	1	1	1	1
1.47	1	1	1	1	1	1	1	1
1.48	1	1	1	1	1	1	1	1
1.49	1	1	1	1	1	1	1	1
1.50	1	1	1	1	1	1	1	1
1.51	1	1	1	1	1	1	1	1
1.52	1	1	1	1	1	1	1	1
1.53	1	1	1	1	1	1	1	1
1.54	1	1	1	1	1	1	1	1
1.55	1	1	1	1	1	1	1	1
1.56	1	1	1	1	1	1	1	1
1.57	1	1	1	1	1	1	1	1
1.58	1	1	1	1	1	1	1	1
1.59	1	1	1	1	1	1	1	1
1.60	1	1	1	1	1	1	1	1
1.61	1	1	1	1	1	1	1	1
1.62	1	1	1	1	1	1	1	1
1.63	1	1	1	1	1	1	1	1
1.64	1	1	1	1	1	1	1	1
1.65	1	1	1	1	1	1	1	1
1.66	1	1	1	1	1	1	1	1
1.67	1	1	1	1	1	1	1	1
1.68	1	1	1	1	1	1	1	1
1.69	1	1	1	1	1	1	1	1
1.70	1	1	1	1	1	1	1	1
1.71	1	1	1	1	1	1	1	1
1.72	1	1	1	1	1	1	1	1
1.73	1	1	1	1	1	1	1	1
1.74	1	1	1	1	1	1	1	1
1.75	1	1	1	1	1	1	1	1
1.76	1	1	1	1	1	1	1	1
1.77	1	1	1	1	1	1	1	1
1.78	1	1	1	1	1	1	1	1
1.79	1	1	1	1	1	1	1	1
1.80	1	1	1	1	1	1	1	1
1.81	1	1	1	1	1	1	1	1
1.82	1	1	1	1	1	1	1	1
1.83	1	1	1	1	1	1	1	1
1.84	1	1	1	1	1	1	1	1
1.85	1	1	1	1	1	1	1	1
1.86	1	1	1	1	1	1	1	1
1.87	1	1	1	1	1	1	1	1
1.88	1	1	1	1	1	1	1	1
1.89	1	1	1	1	1	1	1	1
1.90	1	1	1	1	1	1	1	1
1.91	1	1	1	1	1	1	1	1
1.92	1	1	1	1	1	1	1	1
1.93	1	1	1	1	1	1	1	1
1.94	1	1	1	1	1	1	1	1
1.95	1	1	1	1	1	1	1	1
1.96	1	1	1	1	1	1	1	1
1.97	1	1	1	1	1	1	1	1
1.98	1	1	1	1	1	1	1	1
1.99	1	1	1	1	1	1	1	1
1.100	1	1	1	1	1	1	1	1

4.3 **Επιχειρηματικό και Πάροχοι Δραστηριότητας**

Α/Α	Επωνυμία Φορέα (Δόμος Φορέα)	Όνομα	Ποσότητα σπόρων που τρέφονται σπορίδια	ΣΥΝΟΛΟ ποσότητας σπόρων που τρέφονται σπορίδια	Επιχειρηματικός φορέας που τρέφονται σπορίδια	ΣΥΝΟΛΟ ποσότητας σπόρων που τρέφονται σπορίδια	ΣΥΝΟΛΟ ποσότητας σπόρων που τρέφονται σπορίδια	ΣΥΝΟΛΟ ποσότητας σπόρων που τρέφονται σπορίδια	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)
1	Εταιρεία Α	Όνομα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	100%
2	Εταιρεία Β	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
3	Εταιρεία Γ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
4	Εταιρεία Δ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
5	Εταιρεία Ε	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
6	Εταιρεία ΣΤ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
7	Εταιρεία Ζ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
8	Εταιρεία Η	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
9	Εταιρεία Θ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
10	Εταιρεία Ι	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
11	Εταιρεία Κ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
12	Εταιρεία Λ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
13	Εταιρεία Μ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
14	Εταιρεία Ν	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
15	Εταιρεία Ξ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
16	Εταιρεία Ο	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
17	Εταιρεία Π	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
18	Εταιρεία Ρ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
19	Εταιρεία Σ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
20	Εταιρεία Τ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
21	Εταιρεία Υ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
22	Εταιρεία Φ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
23	Εταιρεία Χ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
24	Εταιρεία Ψ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
25	Εταιρεία Ω	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
26	Εταιρεία ΑΑ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
27	Εταιρεία ΑΒ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
28	Εταιρεία ΑΓ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
29	Εταιρεία ΑΔ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
30	Εταιρεία ΑΕ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
31	Εταιρεία ΑΣΤ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	50%
32	Εταιρεία ΑΖ	Όνομα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				



**ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Αναφέρει τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διόχησης πληροφορησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκαταρμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.  
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (η αναφοράς στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, δελτία κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβείτε τους 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

ΝΑΙ	Αριθμός χαρακτήρων 805
<p>Σε όλα τα έγγραφα του Υπουργείου Τουρισμού (διακηρύξεις, συμβόλαια) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Επιπλέον, πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα κατάληξαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Τέλος, όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.</p> <p>Επίσης για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού (τρισελίδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι, πόνητες τσάντες και ραδιοφωνικό spot - Παραδοτέο 2.2.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p>	

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβείτε τους 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

ΟΧΙ	Αριθμός χαρακτήρων 1

Έχουν επισυναφθεί τα αντίγραφα του πρωτοβάθμιου ελέγχου των πιστοποιήσεων όλων των εταιριών.

### 3.6 7<sup>η</sup> Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

  	Α/Α Έκθεσης Προόδου: 7 Ημερομηνία Υποβολής: 19/1/2022 Κωδικός MIS: 5035557 Αρ.Πρωτ/Ημερομηνία:
(συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Φτιάθη)	
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A                  ΕΛΛΑΔΑ -ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020                  ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ</b> Η προσασία του αρχείου excel δεν πρέπει να καταργηθεί.	
Η αναφορά πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά και με e-mail στη διεύθυνση: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" Κοινή Γραμματεία "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020" Balkan Center, Κτήριο Δ, 2ος Ανελευστήρας, 3ος όροφος 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Tel.: +30 2310 024060 Fax: +30 2310 024078 E-mail: jts_grcy@mou.gr	
Τίτλος Έργου	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
Ακρωνύμιο Έργου	Re-Cult

**ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>ΑΣΟΝΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ</b>	3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
<b>ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ</b>	6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ</b>	6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
<b>ΕΙΣΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ</b>	3.2 Βελτίωση της ελαστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
<b>ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ</b>	Re-Cult
<b>ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	
<b>ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</b>	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
<b>ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ</b>	Κύπρος

A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞ)
Κατ Δικ (Δ 1)	Υπουργείο Τουρισμού ΚΔ	Κύπρος	106.663,00 €
Δ2	Υπουργείο Τουρισμού	Ελλάδα	80.860,00 €
Δ3	Ιερό Αρχαιολογικό Κύπρου	Ελλάδα	380.827,50 €
Δ4	Βουκοβίνα της Ελλάδας	Ελλάδα	310.000,00 €
Δ5	Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου	Κύπρος	290.000,00 €
Δ6	Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Εθνικός Λαογραφικός Ίδρυμας	Ελλάδα	240.000,00 €
Δ7	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	Κύπρος	315.000,00 €
Δ8	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιερού Μητροπολίτου Σάμου	Ελλάδα	195.000,00 €
Δ9			
Δ10			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.918.370,50 €</b>

Υπόμνημα	Όνομα	Θέση στον φορέα	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	E-mail	ΠΡΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΑ
Υπόμνημα Δεσφόμενος	Όνομα	Θεοδόσης (Κάθιστο) Θεοδόσης	Υπουργείο Τουρισμού	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα	210 3736395	210 3736136
	Θέση στον φορέα	Υπουργός Τουρισμού				
	Διεύθυνση	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα				
Υπόμνημα Έργου	Όνομα	Νικόλαος Αποστολέρη	Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα	210 3736115	210 3736136
	Θέση στον φορέα	Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής				
	Διεύθυνση	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα				
Υπόμνημα Οικονομικός Υπόμνημας	Όνομα	Ευαγγέλιος Καλλυκεροπούλου	Υπάλληλος Διαθέσεως Οικονομικών Υπευθύνων	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα	210 3736395	210 3736136
	Θέση στον φορέα	Υπάλληλος Διαθέσεως Οικονομικών Υπευθύνων				
	Διεύθυνση	Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα				

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νόμιμου εκπαιδευτή, του υπεύθυνου Έργου ή του οικονομικού υπεύθυνου παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα νέα στοιχεία

<b>Περίοδος Αναφοράς</b>	<b>Έναρξη</b>	1/7/2021	<b>Λήξη</b>	31/12/2021		
<b>Διάρκεια Έργου</b>	<b>Έναρξη</b>	1/1/2018	<b>Λήξη</b>	30/9/2022	<b>Διάρκεια</b>	<b>48,0</b>

**ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

**2.1 Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα**

Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασιών, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας.  
Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 2000

Παρακαλείσθε να μην υπερβαίνετε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί

Αριθμός χαρακτήρων 1690

Από την έναρξη του έργου έως σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού έκανε όλες τις προσαρμοζόμενες διοικητικές ενέργειες, για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ροής του έργου και την ομαλή υλοποίησή του. Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε μέσω των εκπροσώπων του στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Λευκωσία στις 15.02.2019, στη 2η τεχνική συνάντηση στις 04.10.2019 στη Σύρο και στην 3η τεχνική συνάντηση στις 27.02.2020 στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας τη συμμετοχή του στο έργο, τον προβλεπόμενο τρόπο υλοποίησης, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και το χρονοδιάγραμμα των αναθέσεων (Π1.2.2). Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου, το Υπουργείο Τουρισμού υπέγραψε στις 09.09.19 σύμβαση συνεργασίας με Τεχνικό Σύμβουλο (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.3).

Στις 11.11.2019 το Υπ. Τουρισμού υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία για την παραγωγή «Ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής» κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών (Π2.2.2). Στις 13.11.2020 το Υπουργείο Τουρισμού παρέλαβε το σύνολο του Παραδοτέου. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Διακήρυξης στις 18.09.2019 για τη διενέργεια συντονιστικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» (Π 2.2.1, 3.2.1, 3.2.2), το Υπ. Τουρισμού υπέγραψε στις 16.03.2020 σύμβαση με τον Ανάδοχο. Η σύμβαση επεκτάθηκε έως τις 30.09.2021, λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού του COVID-19. Η αρχική εκδήλωση για το Π2.2.1 διοργανώθηκε στις 28.09.2021 και η στεγνή τράπεζα για το Π3.2.2 διοργανώθηκε στις 22/07/2021. Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση στις 23/04/2021 (Π 1.2.2).

**2.2 Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς**

Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς

Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός χαρακτήρων 347

Διοργάνωση της στεγνής τράπεζας στις 22 Ιουλίου 2021 (Παραδοτέο 3.2.2) και ολοκλήρωση του παραδοτέου 3.2.2 «Ενέργειες διαβούλευσης με φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη». Διοργάνωση της ανοχτής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 (Παραδοτέο 2.2.1). Έκδοση του 1ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.2.4)

**2.3 Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.**

Παρακαλείσθε να παρέχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων.

Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 4000

Παρακαλείσθε να μην υπερβαίνετε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί

Αριθμός Χαρακτήρων 148

Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση (Π 1.2.2). Υποβολή αιτήματος για την 2η διοικητική επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο 1.2.4).

**2.4 Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου**  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός Χαρακτήρων 0

**2.5 Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις**  
 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός χαρακτήρων 76

Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς.

**2.6 Αλλαγές στην Υλοποίηση**  
 Παρακαλείσθε να δηλώσετε οποιαδήποτε αλλαγή προτίθεστε να κάνετε σε σχέση με την εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να τηρεί αυστηρά τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές χωρίς τη γνώση και έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ για τις σημαντικές αλλαγές ενδέχεται να απαιτείται υποβολή αναθεωρημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου. Επιπλέον, οι σημαντικές αλλαγές/τροποποιήσεις του έργου ενδέχεται να απαιτούν και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στον ισχύοντα Οδηγό Έργου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  
 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500

Αριθμός Χαρακτήρων 38

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην υλοποίηση







**ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφορησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το συγκεκριμένο Τεχνικό Έργο καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.  
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενήμερωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβαίνει τους 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

<b>ΝΑΙ</b>	<p>Σε όλα τα έγγραφα του Υπουργείου Τουρισμού (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης.</p> <p>Επίσης, διοργανώθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου 2.2.1 στην Κρήτη και η στρογγυλή τράπεζα στη Ρόδο στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.2.2. Για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας και εκδόθηκαν σχετικά δελτία τύπου.</p>	Αριθμός χαρακτήρων 443
------------	---	---------------------------

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβαίνει τους 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

<b>ΟΧΙ</b>		Αριθμός χαρακτήρων 1
------------	--	-------------------------

Έχουν επισυναφθεί τα αντίγραφα του πρωτοβάθμιου ελέγχου των πιστοποιήσεων όλων των εταιρών.

### 3.7 8<sup>η</sup> Αναφορά Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

   (συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Γραφείο)	Α/Α Έκθεσης Προόδου: 8 Ημερομηνία Υποβολής: 20/7/2022 Κωδικός MIS: 5035557 Αρ.Πρωτ /Ημερομηνία
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ</b> Η προσασία του αρχείου excel δεν πρέπει να καταργηθεί.	
Η αναφορά πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά και με e-mail στη διεύθυνση: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" Κοινή Γραμματεία "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020" Balkan Center, Κτήριο Δ. 2ος Ανεκκυστήρας, 3ος όροφος 10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Tel.: +30 2310 024060 Fax: +30 2310 024078 E-mail: jts_grcy@mou.gr	
Τίτλος έργου	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου
Ακρόνυμο Έργου	Re-Cult

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	3. Διερεύνηση και προσαρμογή του περιβάλλοντος και πρόληψη ανθρώνων		
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	6 Διερεύνηση και προσαρμογή του περιβάλλοντος και πρόληψη της αποδοτικότητας των πόρων		
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	6c. Διερεύνηση, προσαρμογή, πρόληψη και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	3.2 Βελτίωση της ελεγκτικότητας των πεδίων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος		
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου		
ΑΚΡΟΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ	Re-Cult		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6343		
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Κύπρος		
A/A ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΕΚΕΦΕΡΙΘΩΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞ)
Κατ Δικ (Α.1)	Υπουργείο Τουρισμού ΚΑ	Κύπρος	106.683,00 €
Α2	Υπουργείο Τουρισμού	Ελλάδα	80.860,00 €
Α3	Ιατρ. Αρχαιολογική Κύπρου	Ελλάδα	360.827,00 €
Α4	Εκκλησία της Ελλάδος	Ελλάδα	210.000,00 €
Α5	Συνέλευση Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου	Κύπρος	290.000,00 €
Α6	Πανεπιστήμιο Λαλείου - Εθνικός Λογιστηριακός Τραπέζος	Ελλάδα	240.000,00 €
Α7	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	Κύπρος	215.000,00 €
Α8	Κέντρο Τραπέζος και Ανάπτυξης Ιατρ. Μητροπόλεως Κύπρου	Ελλάδα	195.000,00 €
Α9			
Α10			
ΣΥΝΟΛΟ			1.918.370,50 €
Νόμιμος Εκπαιδευτικός	Όνομα	Βασίλειος Χαλκιάς	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
	Θέση στον φορέα	Υπουργείο Τουρισμού	
	Αποδέκτης	Λεωφόρος Αρμάδας 12, 10557, Αθήνα	
	Τηλέφωνο	210 3726295	
Υπεύθυνος Έργου	Όνομα	Εύα Σπυρίδου	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
	Θέση στον φορέα	Πολιτισμική και Φυσική Περιεχόμενα Προγραμμάτων Διοικητικής Επιτροπής	
	Αποδέκτης	Λεωφόρος Αρμάδας 12, 10557, Αθήνα	
	Τηλέφωνο	210 3726115	
Οικονομικός Υπεύθυνος	Όνομα	Ευγενία Καλογρασοπούλου	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
	Θέση στον φορέα	Υδατικές Διαθέσιμες Οικονομικών Υπαλλήλων	
	Αποδέκτης	Λεωφόρος Αρμάδας 12, 10557, Αθήνα	
	Τηλέφωνο	210 3726295	

Τα παρόντως ελλείψεις των στοιχείων επικοινωνίας του νόμιμου εκπαιδευτικού, του υπεύθυνου έργου ή του οικονομικού υπεύθυνου παρακαλούνται όπως επιστείλουν τα νέα στοιχεία

Περίοδος Αναφοράς	Έναρξη	1/1/2022	Λήξη	30/6/2022
Διάρκεια Έργου	Έναρξη	1/10/2018	Λήξη	30/9/2022
				Διάρκεια 48,0

**ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

**2.1 Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα**  
 Παρακαλείσθε να περιγράψετε το βασικό επίτευγμα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πόδι αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προσπεύμενη αξία της συνεργασίας.  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 2000  
 Παρακαλείσθε να μην υπερβείτε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί Αριθμός χαρακτήρων 1907

Από την έναρξη του έργου έως σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού έκανε όλες τις προσαποδόμενες διοικητικές ενέργειες, για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής ραφής του έργου και την ομαλή υλοποίησή του. Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε μέσω των εκπροσώπων του στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Λευκωσία στις 15.02.2019, στη 2η τεχνική συνάντηση στις 04.10.2019 στη Σύρο και στην 3η τεχνική συνάντηση στις 27.02.2020 στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας τη συμμετοχή του στο έργο, τον προβλεπόμενο τρόπο υλοποίησης, το προτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και το χρονοδιάγραμμα των αναθέσεων (Π1.2.2). Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης υποβολής προφορών για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου, το Υπουργείο Τουρισμού υπέγραψε στις 09.09.19 σύμβαση συνεργασίας με Τεχνικό Σύμβουλο (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.3). Έκδοση του 1ου και 2ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.2.4).

Στις 11.11.2019 το Υπ. Τουρισμού υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία για την παραγωγή «Ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού πληροφόρησης και προβολής» κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης υποβολής προφορών (Π2.2.2). Στις 13.11.2020 το Υπουργείο Τουρισμού παρέλαβε το σύνολο του Παραδοτέου. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Διακήρυξης στις 18.09.2019 για τη διενέργεια συνολικού διεγχειρισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» (Π 2.2.1, 3.2.1, 3.2.2), το Υπ. Τουρισμού υπέγραψε στις 16.03.2020 σύμβαση με τον Ανάδοχο. Η σύμβαση επιστράφηκε έως τις 30.09.2021, λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του περιορισμού του COVID-19. Η αρχική εκδήλωση για το Π2.2.1 διοργανώθηκε στις 28.09.2021 και η στοργική τράπεζα για το Π3.2.2 διοργανώθηκε στις 22/07/2021. Συμμετοχή στην 4η Τεχνική Συνάντηση στις 23/04/2021 (Π 1.2.2). Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση στις 17/3/2022 στη Λεμεσό (Π1.2.2). Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου στις 23/6/2022 στη Λευκωσία.

**2.2 Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς**  
 Περιγράψτε το κυριότερο επίτευγμα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς.  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500 Αριθμός χαρακτήρων 211

Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση στις 17/3/2022 στη Λεμεσό (Π1.2.2). Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου στις 23/6/2022 στη Λευκωσία. Έκδοση του 2ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.2.4).

**2.3 Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.**  
 Παρακαλείσθε να παρέχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων.  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 4000  
 Παρακαλείσθε να μην υπερβείτε τους 1000 χαρακτήρες σε κάθε κελί Αριθμός Χαρακτήρων 317

Συμμετοχή στην 5η Τεχνική Συνάντηση στις 17/3/2022 στη Λεμεσό (Π1.2.2). Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου στις 23/6/2022 στη Λευκωσία όπου το Υπ. Τουρισμού παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων από την συμμετοχή του Υπουργείου στο Έργο. Έκδοση του 2ου πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών (Παραδοτέο 1.2.4).

**2.4** **Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου**  
 Ο μέγιστος συνολικός επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500 Αριθμός Χαρακτήρων 229

Συμμετοχή στην 6η Ταχυνική Συνάντηση (Π1.2.2), στην τελική εκδήλωση της Πράξης στην Ελλάδα (Π2.2.1) και στο τελικό συνέδριο του έργου (Π2.2.3) Υποβολή απήματος για επαλήθευση δαπανών στο πλαίσιο του έργου (Παροδοτέο 1.2.4).

**2.5** **Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις**  
 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500 Αριθμός χαρακτήρων 76

Δεν προέκυψαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου κατά την περίοδο αναφοράς.

**2.6** **Αλλαγές στην Υλοποίηση**  
 Παρακαλείσθε να δηλώσετε οποιαδήποτε αλλαγή προτίθεστε να κάνετε σε σχέση με την εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να τηρεί αυστηρά τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Ταχυνικό Δελτίο Έργου. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές χωρίς τη γνώση και έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ για τις σημαντικές αλλαγές ενδέχεται να απαιτείται υποβολή ανασταθμισμένου Ταχυνικού Δελτίου Έργου. Επιπλέον, οι σημαντικές αλλαγές/τροποποιήσεις του έργου ενδέχεται να απαιτούν και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στον κατόνιο Οδηγό Έργου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  
 Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500 Αριθμός Χαρακτήρων 39

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην υλοποίηση.







**ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφορησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκαταρμένοΤεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες. Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Τομέων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (η αναφοράς στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, δελτία κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβούν οι 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

Αριθμός χαρακτήρων 956

<b>ΝΑΙ</b>	<p>Σε όλα τα έγγραφα του Υπουργείου Τουρισμού (διακηρύξεις, συμβάσεις) που αφορούν στο έργο, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Επιπλέον, πριν τη δημοσίευση των διακηρύξεων, τα σχετικά έγγραφα επόλησαν στην Κοινή Γραμματεία για έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Τέλος, όσον αφορά στη δημοσίευση των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.</p> <p>Επίσης για το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης που παραδόθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού (τρισέλιδα φυλλάδια προβολής, USBs, αφίσες, roll-up banner, φάκελοι, πάνινες τσάντες και ραδιοφωνικό spot - Παραδοτέο 2.2.2), χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα λογότυπα και οι αναφορές στην πηγή χρηματοδότησης. Τέλος, στις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Δημοσιότητας (παραδοτέο 2.2.1 και 3.2.2).</p>
------------	--

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός χαρακτήρων είναι 1500  
(Παρακαλούμε να μην υπερβούν οι 1500 χαρακτήρες σε κάθε κελί)

Αριθμός χαρακτήρων 1

<b>ΟΧΙ</b>	
------------	--

Έχουν επισυναφθεί τα αντίγραφα του πρωτοβάθμιου ελέγχου των πιστοποιήσεων όλων των σταθμών.
